

INFORME TRIMESTRAL

VIGILANCIA AMBIENTAL PFV MAS DE GIL

Nombre de la instalación:	FV "MAS DE GIL" de 13 MW
Provincia/s ubicación de la instalación:	Huesca
Nombre del titular:	RENOVABLES DEL CAPITÁN, SL
CIF del titular:	B99524134
Nombre de la empresa de vigilancia	Athmos Sostenibilidad S.L.
Tipo de EIA:	Simplificada
Informe de FASE de:	CONSTRUCCIÓN
Periodicidad del informe según DIA:	TRIMESTRAL
Año de seguimiento nº:	AÑO 1
Nº de informe y año de seguimiento	INFORME nº02 del AÑO 1
Período que recoge el informe	OCTUBRE-DICIEMBRE 2024



ÍNDICE

1.	HOJA DE FIRMAS.....	2
2.	JUSTIFICACIÓN.....	3
3.	INTRODUCCIÓN	4
3.1.	Organización del documento	4
3.2.	Descripción general de las infraestructuras	5
4.	TAREAS ASOCIADAS A LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y AL PVA 7	
5.	PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL FASE DE OBRAS	10
6.	INCIDENCIAS MEDIO AMBIENTALES DETECTADAS.....	11
7.	CONCLUSIONES	12
	PLANOS	13

1. HOJA DE FIRMAS

El siguiente informe está suscrito por ATHMOS SOSTENIBILIDAD:

En Zaragoza, a 31 de diciembre 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Luis', with a long horizontal stroke extending to the right.

Jose Luis Cabello Morales

Vigilante ambiental y social PFV Mas de Gil

Graduado en Ciencias Ambientales

2. JUSTIFICACIÓN

El presente informe corresponde con el **segundo informe** de las actuaciones en fase de obra de la vigilancia ambiental, relativo a los meses de **octubre a diciembre de 2024** en fase de construcción, el cual ha sido redactado para dar cumplimiento al condicionado 21 de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) (INAGA 500806/01M/2020/10298) referente al proyecto de instalaciones de generación mediante energía solar fotovoltaica en la planta Mas de Gil y evacuación de la energía eléctrica:

“Fase de construcción y Fase de ejecución del desmantelamiento y demolición: informes trimestrales. (...)”

Este informe ha sido elaborado por ATHMOS SOSTENIBILIDAD y suscrito por el técnico titulado responsable de la vigilancia ambiental, cuyo nombramiento se hizo extensible a los Servicios Provinciales de los Departamentos de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca., en junio de 2024. El mismo, recoge las acciones descritas en el Plan de Vigilancia Ambiental que se detalla en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Mas de Gil, así como las medidas adicionales recogidas en la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental, emitida por el INAGA.

La promotora del proyecto es RENOVABLES DEL CAPITÁN, SL.

La empresa contratada para la realización de la Vigilancia Ambiental para el proyecto Mas de Gil es en este caso ATHMOS Sostenibilidad, S.L.

3. INTRODUCCIÓN

3.1. Organización del documento


Con el objetivo de hacer más sencillo el manejo y comprensión del documento, a continuación, se enumeran los apartados de los que consta el presente informe, incluyendo una breve descripción de los mismos.

Los apartados en los que se divide el informe cuatrimestral son los siguientes:

- Apartado 3. INTRODUCCIÓN en este apartado se hace una breve descripción de las infraestructuras del proyecto MAS DE GIL sobre las que se realiza la vigilancia ambiental, así como de las fases de ejecución de las obras de construcción de las mismas.
- Apartado 4. TAREAS ASOCIADAS A LA DECLARACION DE IMPACTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y AL PVA en este apartado se detallan las tareas, comunicaciones y trámites asociados a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para cada una de las infraestructuras de generación, transformación y evacuación del Proyecto PFV MAS DE GIL, así como el estado de las mismas.
- Apartado 5. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL FASE DE OBRAS, en este apartado se describen los trabajos y controles ambientales realizados en obra durante el mes.
- Apartado 6. INCIDENCIAS MEDIO AMBIENTALES DETECTADAS en este apartado se detallan las incidencias medioambientales detectadas y emitidas durante este mes.
- Apartado 7. CONCLUSIONES, en este apartado se hace un breve resumen del avance de los trabajos y una escueta valoración de la vigilancia ambiental durante el presente mes.
- Anexo 1. PLANOS, en este apartado se muestran los planos de la implantación, afecciones ambientales y municipios afectados del proyecto MAS DE GIL

3.2. Descripción general de las infraestructuras


El proyecto Mas de Gil, en el cual se realiza la Vigilancia Ambiental, se ubica en el término municipal de Fraga, en la provincia de Huesca, tal y como puede observarse en el Mapa 1:

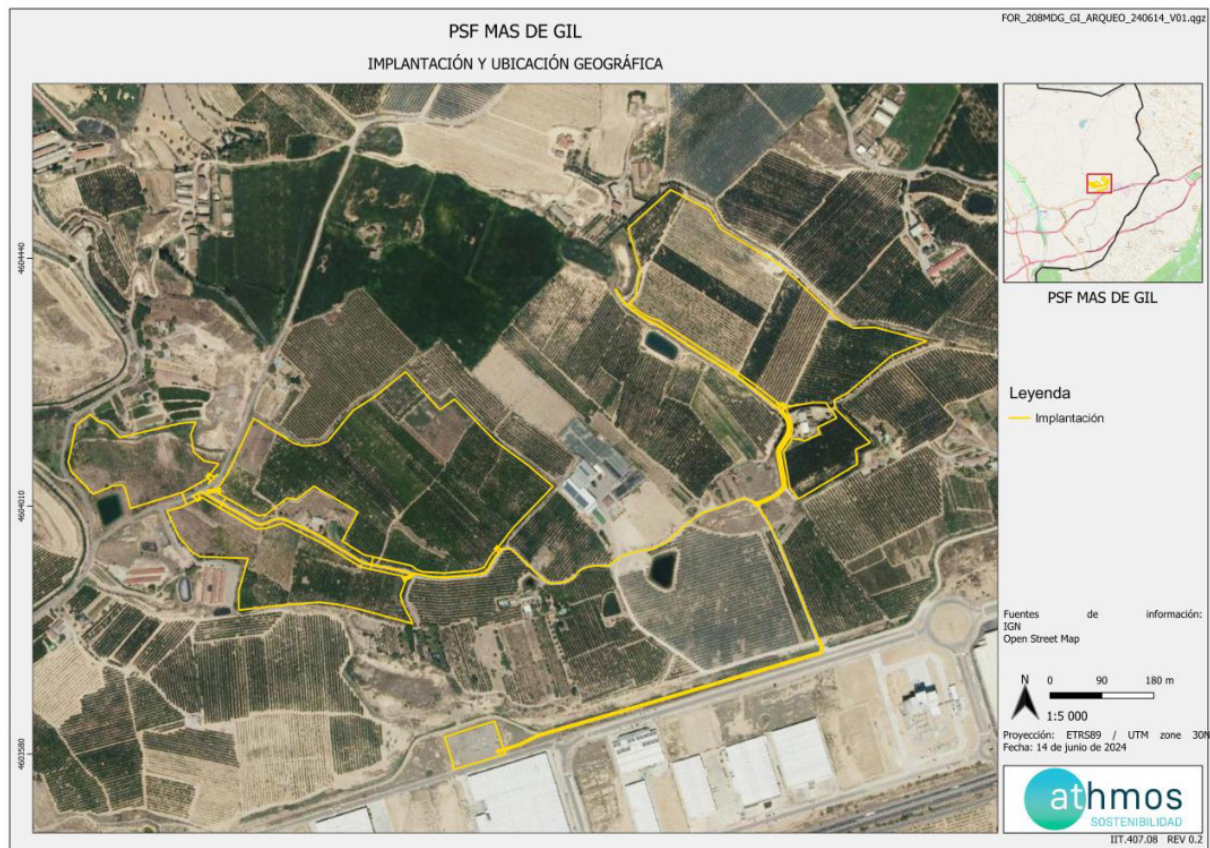

Mapa 1 Implantación del proyecto Mas de Gil. Fuente: Elaboración propia

Este proyecto está formado por una planta fotovoltaica de 13 MW y de una línea subterránea de evacuación hasta el punto de conexión en la SET PL Fraga 25 kV.

Para complementar, se puede observar las afecciones en el siguiente plano.

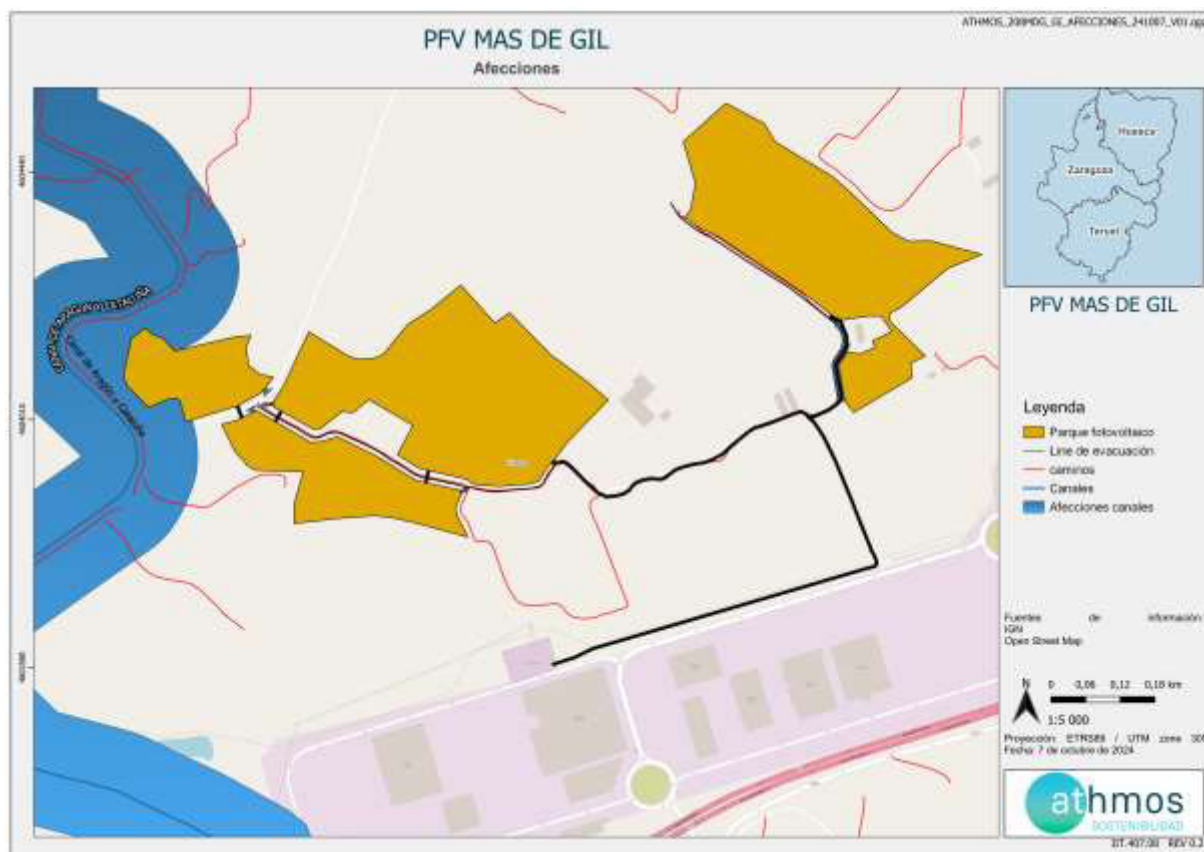

Mapa 1 Afecciones del proyecto Mas de Gil. Fuente: Elaboración propia


Nota: El detalle individualizado de la implantación de cada una de las infraestructuras del Proyecto MAS DE GIL, así como las distintas afectaciones, se encuentra en el ANEXO 1 Planos.

4. TAREAS ASOCIADAS A LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y AL PVA

En este apartado se detallan los trabajos y trámites realizados en este periodo trimestral, asociados a las Declaraciones de Impacto Ambiental, para cada una de las infraestructuras de generación, transformación y evacuación PFV MAS DE GIL

COMUNICACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN

Durante los meses comprendidos entre octubre y diciembre se han realizado un total de 2 comunicaciones, correspondientes a la entrega del informe trimestral anterior. En total, el proyecto ha tenido 13 notificaciones a la administración.



TAREAS IDENTIFICADAS

Las tareas identificadas son aquellas tareas relacionadas con la construcción que se han identificado en la Declaración de Impacto Ambiental, en el Plan de Vigilancia Ambiental y en aquellas resoluciones que pudieran albergar algún condicionado relacionado con el medio ambiente.

Estas tareas se agrupan por tipología, a fin de identificar los medios bióticos y abióticos que se ven afectados por la construcción de la infraestructura, a fin de poder cuantificar aquellos medios que pueden sufrir un mayor impacto a fin de reforzar la vigilancia.

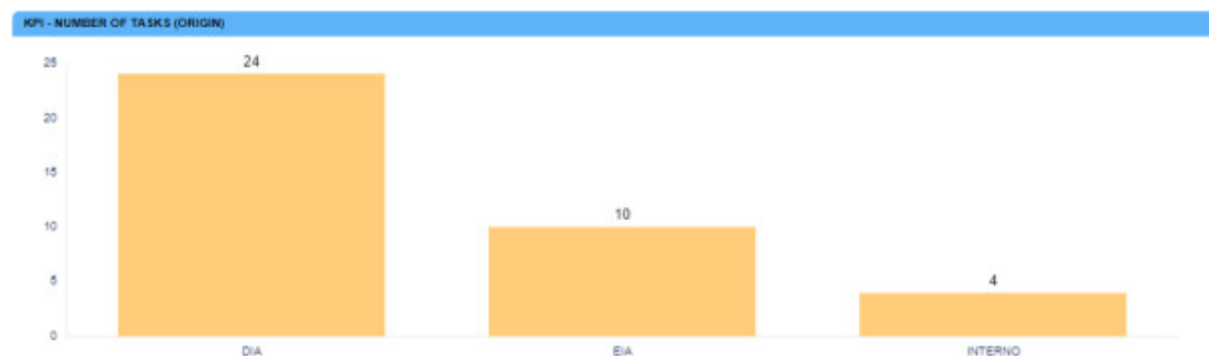


Fig 1 Número total de tareas identificadas por origen

Para la fase de construcción se han identificado un total de 38 tareas, una vez revisada toda la documentación necesaria para determinar las tareas que deben ser realizadas. Los documentos revisados fueron la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la resolución de la Dirección General de Cultura y Patrimonio en materia de Arqueología (DGCP ARQ), licencias de ayuntamientos (LO), resolución del Área de Industria y Energía por el cruzamiento de ENAGAS y REDEXIS (COND. GAS), resolución de carreteras y la resolución de Confederación Hidrográfica del Ebro. Las tareas de origen interno corresponden al trabajo de gabinete que se realiza semanalmente fruto de los trabajos de vigilancia ambiental.

Como se puede observar, la documentación ambiental revisada, hace hincapié en controlar los impactos generados sobre la fauna, vegetación, y asuntos de gobernanza.

4. TAREAS ASOCIADAS A LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y AL PVA

En este apartado se detallan los trabajos y trámites realizados en este periodo trimestral, asociados a las Declaraciones de Impacto Ambiental, para cada una de las infraestructuras de generación, transformación y evacuación PFV MAS DE GIL

COMUNICACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN

Durante los meses comprendidos entre octubre y diciembre se han realizado un total de 2 comunicaciones, correspondientes a la entrega del informe trimestral anterior. En total, el proyecto ha tenido 13 notificaciones a la administración.



TAREAS IDENTIFICADAS

Las tareas identificadas son aquellas tareas relacionadas con la construcción que se han identificado en la Declaración de Impacto Ambiental, en el Plan de Vigilancia Ambiental y en aquellas resoluciones que pudieran albergar algún condicionado relacionado con el medio ambiente.

Estas tareas se agrupan por tipología, a fin de identificar los medios bióticos y abióticos que se ven afectados por la construcción de la infraestructura, a fin de poder cuantificar aquellos medios que pueden sufrir un mayor impacto a fin de reforzar la vigilancia.


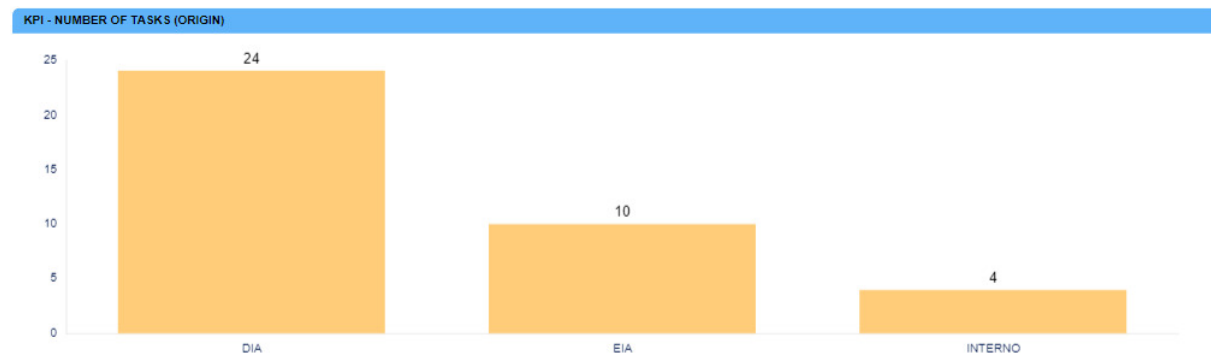


Fig 1 Número total de tareas identificadas por origen

Para la fase de construcción se han identificado un total de 38 tareas, una vez revisada toda la documentación necesaria para determinar las tareas que deben ser realizadas. Los documentos revisados fueron la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la resolución de la Dirección General de Cultura y Patrimonio en materia de Arqueología (DGCP ARQ), licencias de ayuntamientos (LO), resolución del Área de Industria y Energía por el cruzamiento de ENAGAS y REDEXIS (COND. GAS), resolución de carreteras y la resolución de Confederación Hidrográfica del Ebro. Las tareas de origen interno corresponden al trabajo de gabinete que se realiza semanalmente fruto de los trabajos de vigilancia ambiental.

Como se puede observar, la documentación ambiental revisada, hace hincapié en controlar los impactos generados sobre la fauna, vegetación, y asuntos de gobernanza.

KPI - NUMERO DE TAREAS POR TIPOLOGIA

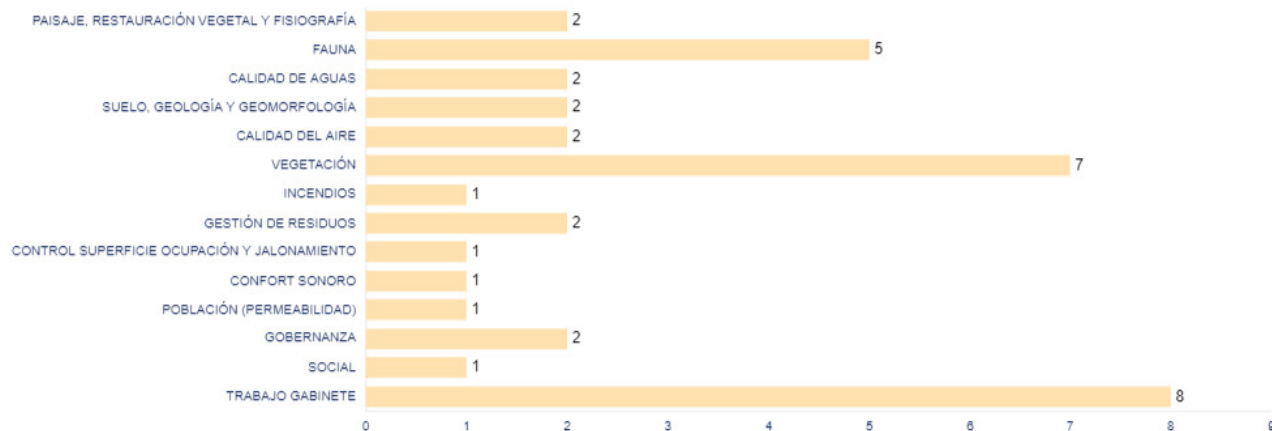

En la siguiente tabla, a modo de listado de comprobación, se muestran las tareas realizadas durante este mes en el parque fotovoltaico. Cada tarea tiene asignado un origen, tipología y condicionado de la DIA a la que hace referencia.


TAREA	ORIGEN	TIPOLOGIA	COND. DIA
Jalonamiento de todas las zonas de obras, quedando sus límites definidos, y de las zonas con vegetación natural a preservar	DIA	CONTROL SUPERFICIE OCUPACIÓN Y JALONAMIENTO	8
Las zonas de acopios de materiales y parques de maquinaria se ubicarán en zonas agrícolas o en zonas desprovistas de vegetación.	DIA	VEGETACIÓN	8
Gestión de los residuos de construcción y demolición	DIA	GESTIÓN DE RESIDUOS	15
Gestión de los residuos	DIA	GESTIÓN DE RESIDUOS	15
Prevención contra incendios	DIA	INCENDIOS	17
Realizar informes semanales	INTERNO	TRABAJO GABINETE	
Control de polvo y partículas	EIA	CALIDAD DEL AIRE	
Control de la alteración y compactación de los suelos	EIA	SUELO, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	
Redes de drenaje y de la calidad de las aguas	EIA	CALIDAD DE AGUAS	
Vigilancia de la protección de la vegetación natural	EIA	VEGETACIÓN	
Control de la retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal	EIA	VEGETACIÓN	
Trabajo de Gabinete	INTERNO	TRABAJO GABINETE	
El vallado perimetral será permeable a la fauna.	DIA	FAUNA	12
Control de gases y humos	EIA	CALIDAD DEL AIRE	
Tratar las aguas residuales, en caso de generarse, con objeto de cumplir los estándares de calidad fijados en la normativa.	DIA	CALIDAD DE AGUAS	6

Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial	DIA	POBLACIÓN (PERMEABILIDAD)	12
Se realizará el extendido de 30 cm de espesor de la tierra vegetal procedente del desbroce y decapado dentro de la planta de manera que se aproveche el banco de semillas que albergue	DIA	VEGETACIÓN	10
Se plantarán especies arbustivas alrededor del vallado perimetral de la planta fotovoltaica con el fin de crear una pantalla visual que minimice el impacto visual y que permita a la instalación mimetizarse mejor con el entorno.	DIA	VEGETACIÓN	13
Control de los niveles de ruido	DIA	CONFORT SONORO	11
Evitar el abandono de cadáveres animales	DIA	FAUNA	14
Vigilancia de la erosión del suelo y taludes	EIA	SUELO, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	
Adecuación paisajística de las instalaciones	EIA	PAISAJE, RESTAURACIÓN VEGETAL Y FISIOGRAFÍA	
Reposición de los servicios afectados	EIA	SOCIAL	
Instalación a lo largo del vallado de placas al tresbolillo por vano para hacerlo más visible a la avifauna.	DIA	FAUNA	12
Desmantelamiento de las instalaciones temporales	EIA	PAISAJE, RESTAURACIÓN VEGETAL Y FISIOGRAFÍA	18
Realizar informes específicos	INTERNO	TRABAJO GABINETE	
Control Arqueológico durante los trabajos de eliminación de arbolado	DGCP ARQ	PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO	

TAREAS REALIZADAS

A continuación, se muestran el total tareas realizadas, en el presente periodo trimestral se han realizado un total de **192 tareas**, sumándose un total de 315 desde el inicio de la actividad.

NUMERO DE TAREAS REALIZADAS

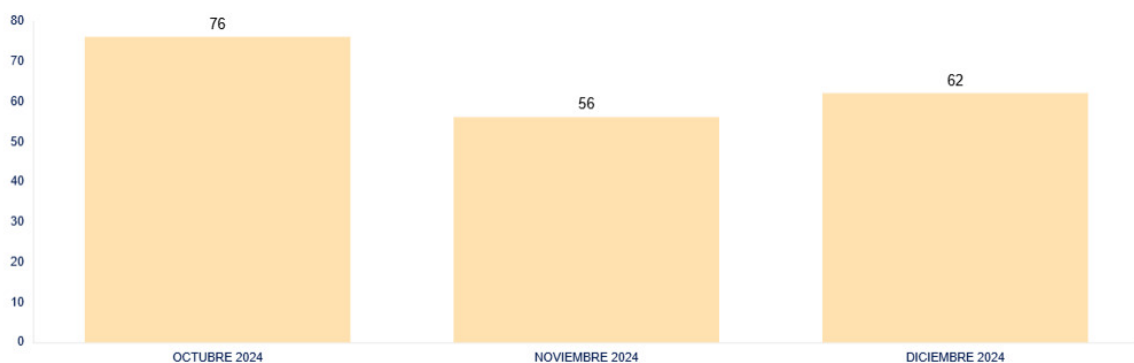

5. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL FASE DE OBRAS

A continuación, se adjuntan los informes semanales que se han ido realizando conforme las obras iban avanzando.

La estructura del informe hace mención a las tareas de vigilancia ambiental que se vienen desempeñando cada día. Además, para hacer el informe más visual se cumplimentan unas “Fichas Control” en las cuales se adjuntan fotos y comentarios de los controles más reseñables realizados durante la semana. También hay un apartado de comunicaciones que se tienen con los agentes implicados en la obra (contratista obra civil, contratista responsable, administraciones públicas, etc.) y un estado de las incidencias que hay abiertas en el parque y el estado en que se encuentran.

PFV MAS DE GIL

INFORME SEMANAL (Semana 40)



1. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y SOCIAL FASE DE OBRA

En el presente informe semanal se detallan las tareas realizadas en la **semana 40 del año 2024** durante la fase de obra del PFV MAS DE GIL.

1.1. SEGUIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024

Este informe corresponde con el **primer informe semanal del mes de octubre**.

1.1.1. Tabla resumen de tareas

En la siguiente tabla vienen detalladas todas las tareas realizadas por el departamento de Sostenibilidad, ya sean las tareas realizadas por el responsable ambiental y social del clúster y las tareas realizadas por el personal de soporte y seguimiento administrativo, relativas a la comunicación con la administración, organismos y terceras partes implicadas en el proyecto, en función de las necesidades y obligaciones del proyecto.

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
1	- SOST - Jalonamiento de todas las zonas de obras, quedando sus límites definidos, y de las zonas con vegetación natural a preservar	02/10/24	DIA	SEMANAL
2	- SOST - Las zonas de acopios de materiales y parques de maquinaria se ubicarán en zonas agrícolas o en zonas desprovistas de vegetación.	02/10/24	DIA	SEMANAL
3	- SOST - Gestión de los residuos de construcción y demolición	02/10/24	DIA	SEMANAL
4	- SOST - Gestión de los residuos	02/10/24	DIA	SEMANAL
5	- SOST - Prevención contra incendios	02/10/24	DIA	SEMANAL
6	- SOST - Control de polvo y partículas	02/10/24	EIA	SEMANAL

EIA: Estudio de Impacto Ambiental; DIA: Declaración de Impacto Ambiental, Cond. Carreteras: Condicionados Carreteras; Cond. CHE: Condicionados Confederación Hidrográfica del Ebro, DGCP ARQ: Dirección General de Patrimonio y Cultura

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
7	- SOST - Control de la alteración y compactación de los suelos	02/10/24	EIA	SEMANAL
8	- SOST - Redes de drenaje y de la calidad de las aguas	02/10/24	EIA	SEMANAL
9	- SOST - Vigilancia de la protección de la vegetación natural	02/10/24	EIA	SEMANAL
10	- SOST - Control de la retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal	02/10/24	EIA	SEMANAL
11	- SOST - Trabajo de Gabinete	04/10/24	INTERNO	SEMANAL
12	- SOST - Realizar informes semanales	04/10/24	INTERNO	SEMANAL
13	- SOST - Realizar informes específicos	30/09/24	INTERNO	CUANDO SEA NECESARIO

Tabla 1. Tabla de tareas realizadas durante la semana 40.

1.1.1.1. Fichas de los controles realizados

A continuación, vienen detalladas todas las fichas de los trabajos realizados que, debido a que son realizadas de forma periódica, y que por norma general llevan asociada documentación complementaria, vienen explicadas en formato de ficha para una mejor comprensión.

1.2. HOJA DE FIRMAS

Este informe está suscrito por los siguientes trabajadores de Athmos Sostenibilidad en,

Zaragoza, a 04 de octubre de 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Luis', with a long horizontal stroke extending to the right.

Fdo: Jose Luis Cabello Morales

Vigilante Ambiental y Social de la Planta
fotovoltaica Mas de Gil.

	PROYECTO PFV LA SERRETA		FICHA CONTROL: COND: 08x02
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 08. TABLA CONDICIONADOS DIA		FECHA: 02/10/2023
TIPO DE CONTROL:	JALONAMIENTO		
CONTROL:	Jalonamiento de instalaciones.		

PROYECTOS: 208MDG
PUNTOS DE CONTROL: Implantación
IMAGENES, MAPAS, TABLAS:   <i>Figuras 1 y 2: Jalonamiento de terrenos de obra.</i>
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Durante la presente semana, se ha vuelto a revisar el correcto jalonamiento de la planta, viéndose categorizadas las estacas con el color naranja, establecido para la colocación del vallado perimetral, y azul, para la localización de los seguidores.

	PROYECTO PFV LA SERRETA		FICHA CONTROL:
			COND: 08x03
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 08. TABLA CONDICIONADOS DIA		FECHA: 02/10/2023
TIPO DE CONTROL:	ACOPIO DE MATERIALES		
CONTROL:	Acopio de materiales de construcción.		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Campamento base

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figuras 1: Acopio de bobina en la plataforma del campamento base

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Los primeros materiales de obra, consistente en bobina de cable, ha llegado a la planta, no colocándose en superficie donde exista vegetación.

Concretamente, se ha utilizado la plataforma del campamento base como zona de acopio.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL:
			COND: 10x02
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 10. REVEGETACIÓN		FECHA: 02/10/2024
TIPO DE CONTROL:	TIERRA VEGETAL		
CONTROL:	Acopio de la tierra vegetal		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Implantación

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Acopios de tierra vegetal.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Durante esta semana se ha comprobado que se siga realizando un correcto acopio de la tierra vegetal resultante de los movimientos de tierra y desbroce previo.

Consecuentemente, se ha visto que se esta gestionando de forma correcta, preparándolo para su posterior extendido.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL: COND: 15x10
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 15. GESTION DE RESIDUOS		FECHA: 04/10/2024
TIPO DE CONTROL:	RESIDUOS		
CONTROL:	Recogida de residuos plásticos.		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Implantación

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Residuos plásticos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Se ha podido observar que los residuos plásticos encontrados en la planta, resultante de los procesos agrarios anteriores, han sido correctamente separados, recogidos y apilados, con el objetivo de poder desecharlos correctamente una vez sea colocado el punto limpio.

PFV MAS DE GIL

INFORME SEMANAL (Semana 41)



1. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y SOCIAL FASE DE OBRA

En el presente informe semanal se detallan las tareas realizadas en la **semana 41 del año 2024** durante la fase de obra del PFV MAS DE GIL.

1.1. SEGUIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024

Este informe corresponde con el **segundo informe semanal del mes de octubre**.

1.1.1. Tabla resumen de tareas

En la siguiente tabla vienen detalladas todas las tareas realizadas por el departamento de Sostenibilidad, ya sean las tareas realizadas por el responsable ambiental y social del clúster y las tareas realizadas por el personal de soporte y seguimiento administrativo, relativas a la comunicación con la administración, organismos y terceras partes implicadas en el proyecto, en función de las necesidades y obligaciones del proyecto.

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
1	- SOST - Jalonamiento de todas las zonas de obras, quedando sus límites definidos, y de las zonas con vegetación natural a preservar	09/10/24	DIA	SEMANAL
2	- SOST - Las zonas de acopios de materiales y parques de maquinaria se ubicarán en zonas agrícolas o en zonas desprovistas de vegetación.	09/10/24	DIA	SEMANAL
3	- SOST - Gestión de los residuos de construcción y demolición	09/10/24	DIA	SEMANAL
4	- SOST - Gestión de los residuos	09/10/24	DIA	SEMANAL
5	- SOST - Prevención contra incendios	09/10/24	DIA	SEMANAL
6	- SOST - Control de polvo y partículas	09/10/24	EIA	SEMANAL

EIA: Estudio de Impacto Ambiental; DIA: Declaración de Impacto Ambiental, Cond. Carreteras: Condicionados Carreteras; Cond. CHE: Condicionados Confederación Hidrográfica del Ebro, DGCP ARQ: Dirección General de Patrimonio y Cultura

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
7	- SOST - Control de la alteración y compactación de los suelos	09/10/24	EIA	SEMANAL
8	- SOST - Redes de drenaje y de la calidad de las aguas	09/10/24	EIA	SEMANAL
9	- SOST - Vigilancia de la protección de la vegetación natural	09/10/24	EIA	SEMANAL
10	- SOST - Control de la retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal	09/10/24	EIA	SEMANAL
	- SOST - El vallado perimetral será permeable a la fauna.	09/10/24	DIA	QUINCENAL
	- SOST - Control de gases y humos	09/10/24	EIA	QUINCENAL
11	- SOST - Trabajo de Gabinete	10/10/24	INTERNO	SEMANAL
12	- SOST - Realizar informes semanales	10/10/24	INTERNO	SEMANAL
13	- SOST - Realizar informes trimestrales	07/10/24	DIA	TRIMESTRAL

Tabla 1. Tabla de tareas realizadas durante la semana 41.

1.1.1.1. Fichas de los controles realizados

A continuación, vienen detalladas todas las fichas de los trabajos realizados que, debido a que son realizadas de forma periódica, y que por norma general llevan asociada documentación complementaria, vienen explicadas en formato de ficha para una mejor comprensión.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL: COND: 08x04
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 08. TABLA CONDICIONADOS DIA	FECHA: 09/10/2023	
TIPO DE CONTROL:	ACOPIO DE MATERIALES		
CONTROL:	Acopio de materiales de construcción.		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Campamento base

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figuras 1: Acopio de los materiales del vallado

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Durante la presente semana se han estado realizando trabajos relacionados con la instalación de los vallados, por lo que los materiales necesarios para la misma se han colocado en terrenos desprovistos de vegetación natural, próximo a la plataforma del campamento base.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL:
			COND: 12x01
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 12. VALLADO		FECHA: 09/10/2024
TIPO DE CONTROL:	INSTALACION DEL VALLADO		
CONTROL:	Revisión de las actividades de vallado		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Vallado exterior de la planta fotovoltaica

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Vallado perimetral.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

La principal actividad que se esta realizando actualmente es la del vallado perimetral de la planta. En el momento del control, el vallado se extendía solo por la plataforma de control, localizándose el primer acceso.

Dicho vallado se encuentra incompleto, necesitando ser debidamente tensado. Se comprobará nuevamente una vez finalizada la instalación.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL: COND: 15x11
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 15. GESTION DE RESIDUOS	FECHA: 09/10/2024	
TIPO DE CONTROL:	RESIDUOS		
CONTROL:	Instalación de punto limpio.		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Implantación

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Contenedor de residuos.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL:
			COND: 15x11
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 15. GESTION DE RESIDUOS		FECHA: 09/10/2024
TIPO DE CONTROL:	RESIDUOS		
CONTROL:	Instalación de punto limpio.		



Figura 2. Contenedor de residuos de cemento.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Durante el transcurso de esta semana, han llegado un par de contenedores, para iniciar el establecimiento del punto limpio. Por ahora dichos contenedores pueden encontrarse junto a la caseta de control, siendo uno de estos utilizados para los residuos de cemento.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL: COND: 17x02
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 15. INCENDIOS		FECHA: 09/10/2024
TIPO DE CONTROL:	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS		
CONTROL:	Revisión de extintores en maquinaria		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Maquinaria empleada en los diversos trabajos.

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Maquina carente de extintor.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Durante la visita de esta semana, se ha comprobado que esta máquina se encuentra sin su correspondiente extintor. Al tratarse de una maquina de pequeño tamaño, se considera que basta con la existencia de un extintor en la cercanía de la misma a la hora de realizar trabajos (extintor de otras maquinas cercanas o de la caseta de control).

Sin embargo, en aquellos casos en los que se use la maquina en entornos lejanos de otra estructura o maquinaria con extintor propio, será necesario que disponga de uno para casos de emergencia.

1.2. HOJA DE FIRMAS

Este informe está suscrito por los siguientes trabajadores de Athmos Sostenibilidad en,

Zaragoza, a 10 de octubre de 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Luis', with a long horizontal stroke extending to the right.

Fdo: Jose Luis Cabello Morales

Vigilante Ambiental y Social de la Planta
fotovoltaica Mas de Gil.

PFV MAS DE GIL

INFORME SEMANAL (Semana 42)



1. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y SOCIAL FASE DE OBRA

En el presente informe semanal se detallan las tareas realizadas en la **semana 42 del año 2024** durante la fase de obra del PFV MAS DE GIL.

1.1. SEGUIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024

Este informe corresponde con el **tercer informe semanal del mes de octubre**.

1.1.1. Tabla resumen de tareas

En la siguiente tabla vienen detalladas todas las tareas realizadas por el departamento de Sostenibilidad, ya sean las tareas realizadas por el responsable ambiental y social del clúster y las tareas realizadas por el personal de soporte y seguimiento administrativo, relativas a la comunicación con la administración, organismos y terceras partes implicadas en el proyecto, en función de las necesidades y obligaciones del proyecto.

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
1	- SOST - Jalonamiento de todas las zonas de obras, quedando sus límites definidos, y de las zonas con vegetación natural a preservar	16/10/24	DIA	SEMANAL
2	- SOST - Las zonas de acopios de materiales y parques de maquinaria se ubicarán en zonas agrícolas o en zonas desprovistas de vegetación.	16/10/24	DIA	SEMANAL
3	- SOST - Gestión de los residuos de construcción y demolición	16/10/24	DIA	SEMANAL
4	- SOST - Gestión de los residuos	16/10/24	DIA	SEMANAL
5	- SOST - Prevención contra incendios	16/10/24	DIA	SEMANAL
6	- SOST - Control de polvo y partículas	16/10/24	EIA	SEMANAL

EIA: Estudio de Impacto Ambiental; DIA: Declaración de Impacto Ambiental, Cond. Carreteras: Condicionados Carreteras; Cond. CHE: Condicionados Confederación Hidrográfica del Ebro, DGCP ARQ: Dirección General de Patrimonio y Cultura

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
7	- SOST - Control de la alteración y compactación de los suelos	16/10/24	EIA	SEMANAL
8	- SOST - Redes de drenaje y de la calidad de las aguas	16/10/24	EIA	SEMANAL
9	- SOST - Vigilancia de la protección de la vegetación natural	16/10/24	EIA	SEMANAL
10	- SOST - Control de la retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal	16/10/24	EIA	SEMANAL
11	- ARQ - Control arqueológico de las parcelas asignadas como de importancia patrimonial	16/10/24	DIA	CUANDO SEA NECESARIO
12	- SOST - Trabajo de Gabinete	18/10/24	INTERNO	SEMANAL
13	- SOST - Realizar informes semanales	18/10/24	INTERNO	SEMANAL

Tabla 1. Tabla de tareas realizadas durante la semana 42.

1.1.1.1. Fichas de los controles realizados

A continuación, vienen detalladas todas las fichas de los trabajos realizados que, debido a que son realizadas de forma periódica, y que por norma general llevan asociada documentación complementaria, vienen explicadas en formato de ficha para una mejor comprensión.

athmos SOSTENIBILIDAD		PROYECTO PFV MAS DE GIL	FICHA CONTROL:
ORIGEN DE CONTROL:		Nº 12. VALLADO	COND: 12x02
TIPO DE CONTROL:		INSTALACION DEL VALLADO	FECHA: 09/10/2024
CONTROL:		Revisión de las actividades de vallado	

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Vallado exterior de la planta fotovoltaica

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Vallado perimetral.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL	FICHA CONTROL: COND: 12x02
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 12. VALLADO	FECHA: 09/10/2024
TIPO DE CONTROL:	INSTALACION DEL VALLADO	
CONTROL:	Revisión de las actividades de vallado	



Figura 2. Vallado perimetral.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Durante la presente visita se ha podido observar el avance del vallado perimetral. Los trabajos han avanzado satisfactoriamente, poniéndose los postes y el extendido de rejado en la mayor parte de la planta. A su vez, se pueden observar la preparación de los pasos de fauna, aunque aún no están terminados.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL:
			COND: 17x03
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 15. INCENDIOS		FECHA: 16/10/2024
TIPO DE CONTROL:	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS		
CONTROL:	Revisión de extintores en maquinaria		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Maquinaria empleada en los diversos trabajos.

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:

A photograph showing two red fire extinguishers standing upright in a cluttered, industrial environment, likely the back of a truck. The extinguishers have black handles and yellow safety pins. The background shows various tools, a green metal box, and other equipment.

Figura 1. Extintores en camión.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:


Referente a la maquina taladradora mencionada en el anterior informe (semana 41) se ha comprobado que durante su funcionamiento cuenta con extintores cerca. En este caso, los extintores están en el camión de materiales que acompaña a la máquina, asegurando su fácil acceso.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL	FICHA CONTROL: COND 05
ORIGEN DE CONTROL:	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Expte.: 025/21/23/2024 Exp. Prev.: 001/21.012	FECHA: 17/10/2024
TIPO DE CONTROL:	Control Arqueológico de los movimientos de tierra	
CONTROL:	Excavación de agujeros para los postes del vallado perimetral	

PROYECTOS:
Planta Fotovoltaica *Mas de Gil*


PUNTOS DE CONTROL:
Control y seguimiento con metodología arqueológica durante la excavación de los agujeros de los postes del vallado perimetral

IMÁGENES, PLANOS Y TABLAS:

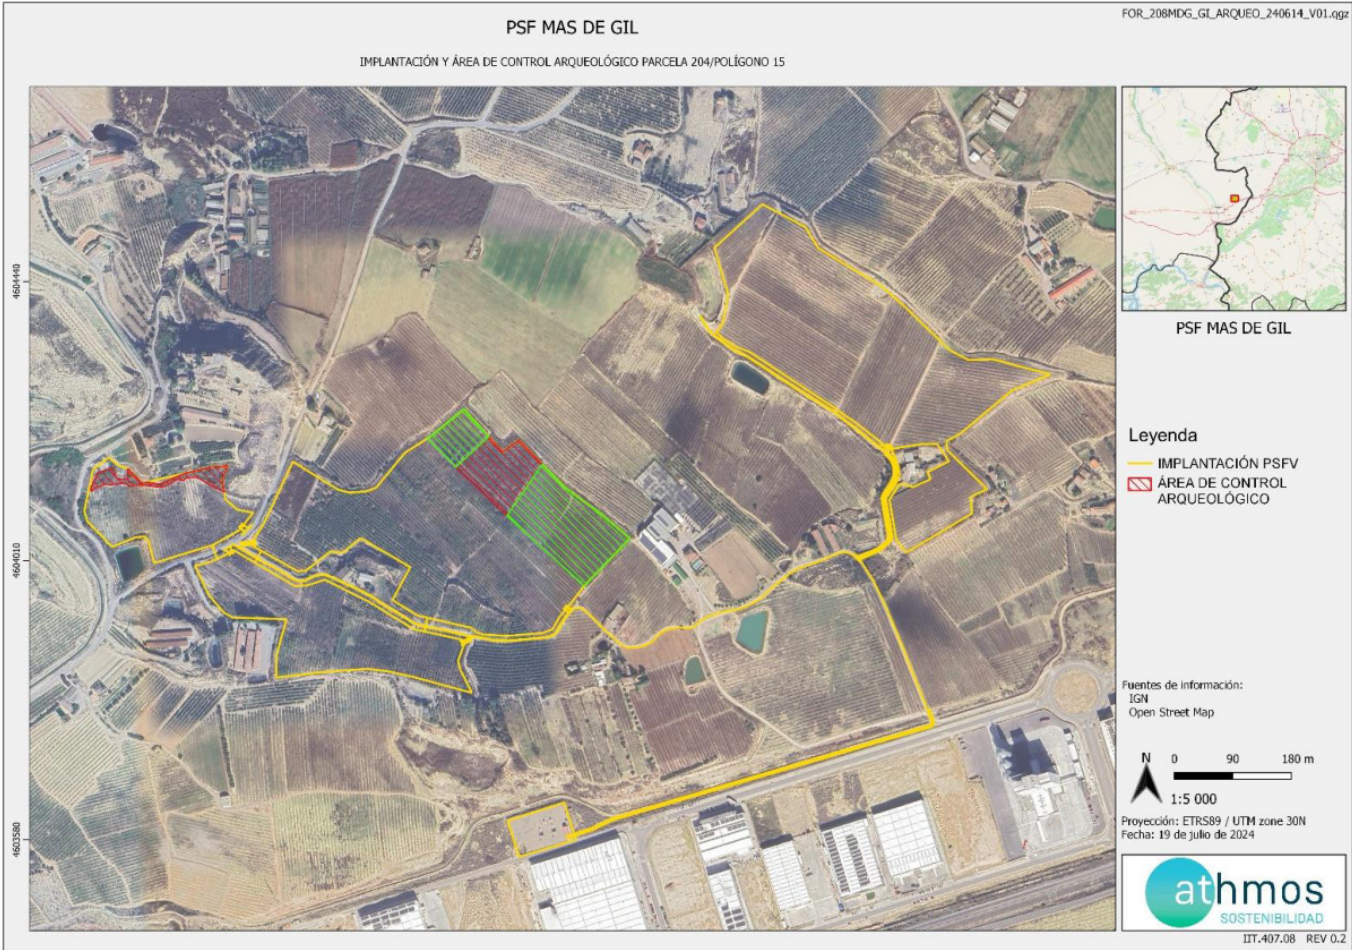

Mapa 1: Ubicación de la Planta Fotovoltaica y áreas de Control Arqueológico

	PROYECTO PFV MAS DE GIL	FICHA CONTROL: COND 05
ORIGEN DE CONTROL:	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Expte.: 025/21/23/2024 Exp. Prev.: 001/21.012	FECHA: 17/10/2024
TIPO DE CONTROL:	Control Arqueológico de los movimientos de tierra	
CONTROL:	Excavación de agujeros para los postes del vallado perimetral	

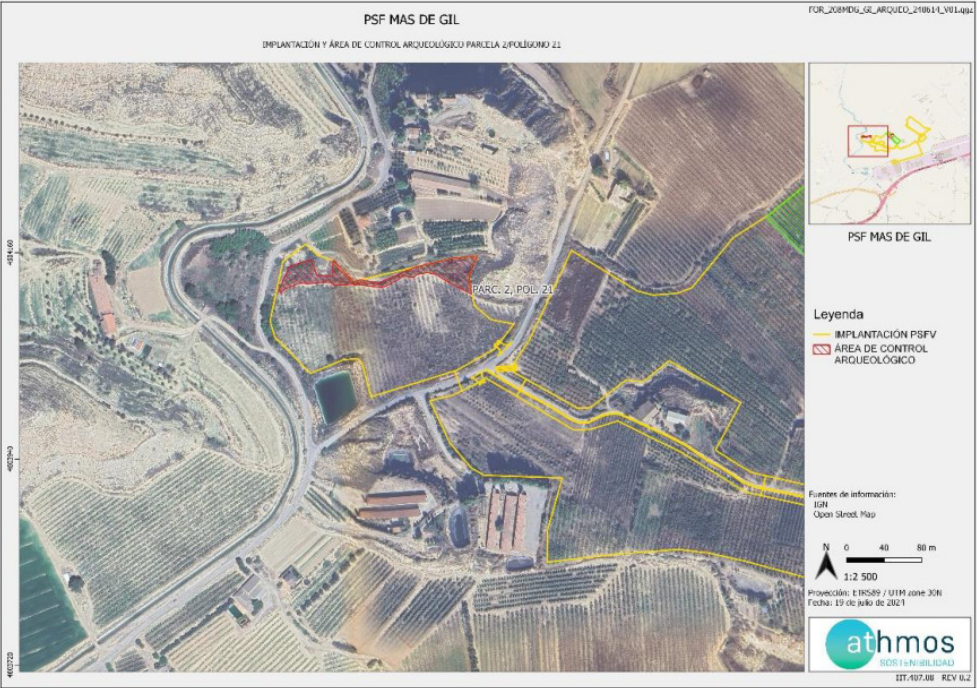

Mapa 2: Control y seguimiento; Parcela 2, Polígono 21



Mapa 3: Control y seguimiento; Parcela 204, Polígono 15

	PROYECTO PFV MAS DE GIL	FICHA CONTROL: COND 05
ORIGEN DE CONTROL:	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Expte.: 025/21/23/2024 Exp. Prev.: 001/21.012	FECHA: 17/10/2024
TIPO DE CONTROL:	Control Arqueológico de los movimientos de tierra	
CONTROL:	Excavación de agujeros para los postes del vallado perimetral	



Imagen 1: Parcela 2, Pol. 21. Agujeros para los postes. General



Imagen 2: Parcela 2, Pol. 21. Agujeros para los postes. General



Imagen 3: Parcela 2, Pol. 21. Agujero de poste. Detalle



Imagen 4: Parcela 2, Pol. 21. Excavación de los agujeros de poste



Imagen 5 Parcela 204, Pol. 15. Vista general con los agujeros



Imagen 6: Parcela 204, Pol. 15. Limpieza manual de los agujeros

	PROYECTO PFV MAS DE GIL	FICHA CONTROL: COND 05
ORIGEN DE CONTROL:	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Expte.: 025/21/23/2024 Exp. Prev.: 001/21.012	FECHA: 17/10/2024
TIPO DE CONTROL:	Control Arqueológico de los movimientos de tierra	
CONTROL:	Excavación de agujeros para los postes del vallado perimetral	

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

El origen de la intervención lo encontramos en los trabajos de prospección arqueológica realizados en mayo de 2021 y en noviembre de 2023 más recientemente, en la zona donde se proyecta la implantación de la Planta Solar Fotovoltaica “Mas de Gil”. Por la mala visibilidad del terreno prospectado, la empresa encargada de los trabajos arqueológicos recomienda

se han establecido dos áreas cuya superficie presentaba una nula visibilidad debido a la presencia de abundante vegetación silvestre que impedía la inspección de la superficie del terreno. Se trata de parte del Polígono 15, Parcela 204 que llevaba largo tiempo sin ser explotada; y de la zona anexa a la acequia del Polígono 21, Parcela 2. Dado que estas condiciones de visibilidad son constantes lo largo del tiempo, al no tratarse de campos en explotación que puedan ser labrados en algún momento, se proponen tareas de control y seguimiento de obra para ambos espacios

La resolución correspondiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural establece en consecuencia que:

Se deberá realizar el control y seguimiento arqueológico del desbrozado y de los movimientos de tierras previstos en la Parcela 204 del Polígono 15 y en la zona anexa a la acequia de la Parcela 2, Polígono 21.

Por tanto, los trabajos realizados tienen como objetivo cumplir con lo citado en la resolución de Patrimonio.

Los días 14 y 16 de octubre se ha realizado el control y seguimiento de los trabajos de excavación de los postes para la instalación del vallado perimetral de la PSFV. Durante la excavación de los agujeros de los postes no se ha constatado la presencia de restos de interés arqueológica susceptibles de ser afectados por las obras en curso.

Pendiente quedarían de control arqueológico el resto de tareas que conlleven movimientos de tierra a realizar en las parcelas delimitadas, como podrían ser la excavación de las zanjas de conexión eléctrica, drenajes, etc. (ver tabla 1).

	PROYECTO PFV MAS DE GIL	FICHA CONTROL: COND 05
ORIGEN DE CONTROL:	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Expte.: 025/21/23/2024 Exp. Prev.: 001/21.012	FECHA: 17/10/2024
TIPO DE CONTROL:	Control Arqueológico de los movimientos de tierra	
CONTROL:	Excavación de agujeros para los postes del vallado perimetral	

PSFV MAS DE GIL.

TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

<i>TÁREA</i>	<i>PREVISIÓN</i>	<i>ESTADO</i>
<i>Arrancado de arbolado de las parcelas</i>	15 AL 17 DE JULIO	REALIZADO
<i>Decapado de las parcelas objeto de Control Arqueológico</i>	15 AL 17 DE JULIO	REALIZADO
<i>Excavación de agujeros de poste para instalación del vallado si afectan a las parcelas objeto de Control Arqueológico</i>	14 y 16 DE OCTUBRE	REALIZADO
<i>Excavación de zanjas de cualquier tipología, si afectan a las parcelas objeto de Control Arqueológico</i>	A PARTIR DE SEPTIEMBRE	PENDIENTE
<i>Otros trabajos que conlleven movimientos de tierra en las parcelas objeto de Control Arqueológico</i>	A PARTIR DE SEPTIEMBRE	PENDIENTE
<i>Nivelaciones, desmontes y actuaciones que precisen remociones de tierra en las parcelas objeto de Control Arqueológico</i>	A PARTIR DE SEPTIEMBRE	PENDIENTE

Tabla 1. Actualización de los trabajos arqueológicos en Mas de Gil

1.2. HOJA DE FIRMAS

Este informe está suscrito por los siguientes trabajadores de Athmos Sostenibilidad en,

Zaragoza, a 18 de octubre de 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Luis', with a long horizontal stroke extending to the right.

Fdo: Jose Luis Cabello Morales

Vigilante Ambiental y Social de la Planta
fotovoltaica Mas de Gil.

PFV MAS DE GIL

INFORME SEMANAL (Semana 43)



1. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y SOCIAL FASE DE OBRA

En el presente informe semanal se detallan las tareas realizadas en la **semana 43 del año 2024** durante la fase de obra del PFV MAS DE GIL.

1.1. SEGUIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024

Este informe corresponde con el **cuarto informe semanal del mes de octubre**.

1.1.1. Tabla resumen de tareas

En la siguiente tabla vienen detalladas todas las tareas realizadas por el departamento de Sostenibilidad, ya sean las tareas realizadas por el responsable ambiental y social del clúster y las tareas realizadas por el personal de soporte y seguimiento administrativo, relativas a la comunicación con la administración, organismos y terceras partes implicadas en el proyecto, en función de las necesidades y obligaciones del proyecto.

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
1	- SOST - Jalonamiento de todas las zonas de obras, quedando sus límites definidos, y de las zonas con vegetación natural a preservar	23/10/24	DIA	SEMANAL
2	- SOST - Las zonas de acopios de materiales y parques de maquinaria se ubicarán en zonas agrícolas o en zonas desprovistas de vegetación.	23/10/24	DIA	SEMANAL
3	- SOST - Gestión de los residuos de construcción y demolición	23/10/24	DIA	SEMANAL
4	- SOST - Gestión de los residuos	23/10/24	DIA	SEMANAL
5	- SOST - Prevención contra incendios	23/10/24	DIA	SEMANAL
6	- SOST - Control de polvo y partículas	23/10/24	EIA	SEMANAL

EIA: Estudio de Impacto Ambiental; DIA: Declaración de Impacto Ambiental, Cond. Carreteras: Condicionados Carreteras; Cond. CHE: Condicionados Confederación Hidrográfica del Ebro, DGCP ARQ: Dirección General de Patrimonio y Cultura

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
7	- SOST - Control de la alteración y compactación de los suelos	23/10/24	EIA	SEMANAL
8	- SOST - Redes de drenaje y de la calidad de las aguas	23/10/24	EIA	SEMANAL
9	- SOST - Vigilancia de la protección de la vegetación natural	23/10/24	EIA	SEMANAL
10	- SOST - Control de la retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal	23/10/24	EIA	SEMANAL
	- SOST - Control de la retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal	23/10/24	DIA	QUINCENAL
	- SOST - El vallado perimetral será permeable a la fauna.	23/10/24	EIA	QUINCENAL
12	- SOST - Trabajo de Gabinete	18/10/24	INTERNO	SEMANAL
13	- SOST - Realizar informes semanales	18/10/24	INTERNO	SEMANAL

Tabla 1. Tabla de tareas realizadas durante la semana 43.

1.1.1.1. Fichas de los controles realizados

A continuación, vienen detalladas todas las fichas de los trabajos realizados que, debido a que son realizadas de forma periódica, y que por norma general llevan asociada documentación complementaria, vienen explicadas en formato de ficha para una mejor comprensión.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL:
			COND: 12x03
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 12. VALLADO		FECHA: 23/10/2024
TIPO DE CONTROL:	INSTALACION DEL VALLADO		
CONTROL:	Revisión de las actividades de vallado		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Vallado exterior de la planta fotovoltaica

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:




Figura 1. Vallado perimetral

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Durante la presente visita se ha podido observar el avance del vallado perimetral. Los trabajos han avanzado satisfactoriamente, poniéndose los postes toda la planta. A su vez, se pueden observar la preparación de los pasos de fauna, aunque aún no están terminados. Aun está pendiente el terminar de poner la maya y las placas de visibilidad para la avifauna.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL	FICHA CONTROL: COND: 17x04
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 15. INCENDIOS	FECHA: 23/10/2024
TIPO DE CONTROL:	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	
CONTROL:	Revisión de extintores en maquinaria	

PROYECTOS: 208MDG
PUNTOS DE CONTROL: Maquinaria empleada en los diversos trabajos.

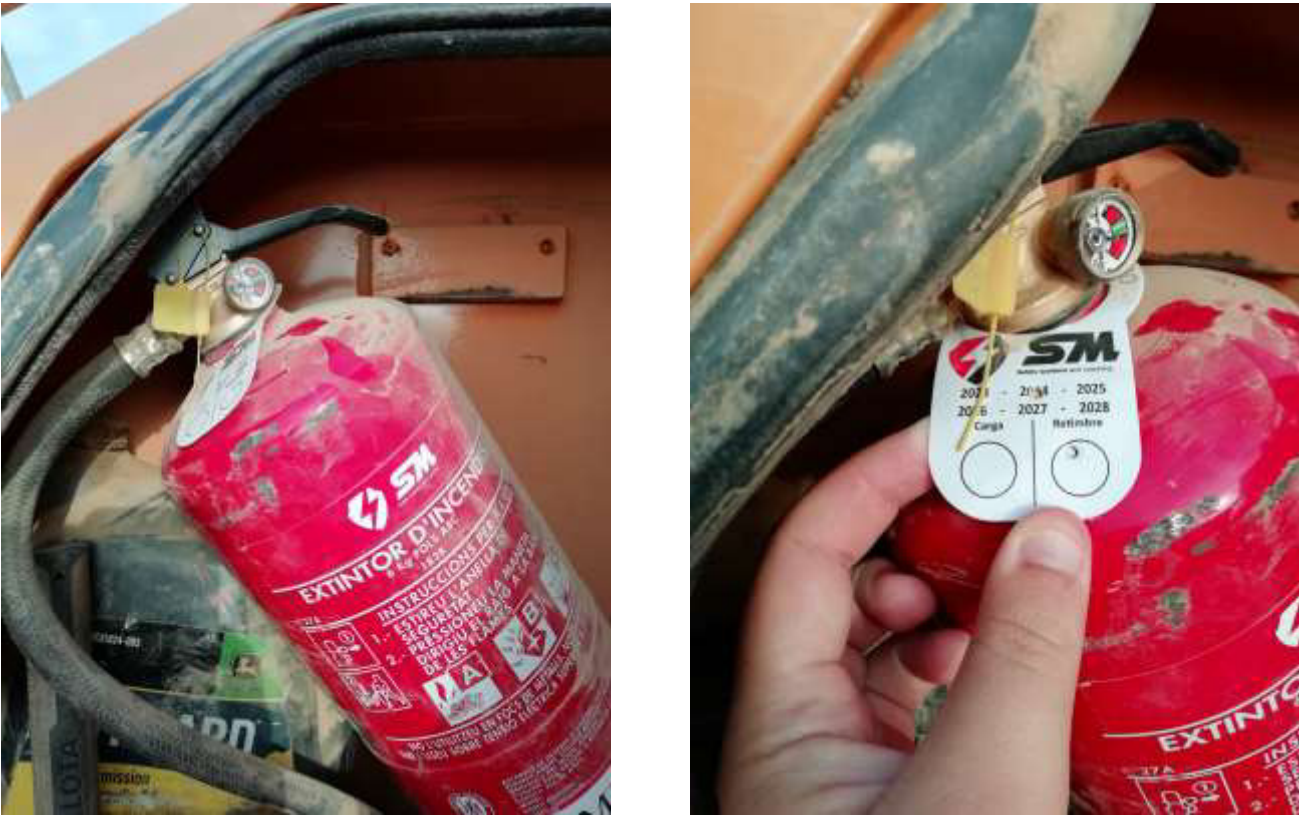IMAGENES, MAPAS, TABLAS: 
Figura 1. Extintor en maquinaria.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Durante la presente visita, en la cual se han visto iniciado los movimientos de tierra correspondientes a la nivelación de los terrenos, se ha comprobado la correcta presencia de extintores en la maquinaria utilizada. Se puede ver que la maquina esta correctamente equipada con un extintor en buenas condiciones.

1.2. HOJA DE FIRMAS

Este informe está suscrito por los siguientes trabajadores de Athmos Sostenibilidad en,

Zaragoza, a 28 de octubre de 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Luis', with a long horizontal stroke extending to the right.

Fdo: Jose Luis Cabello Morales

Vigilante Ambiental y Social de la Planta
fotovoltaica Mas de Gil.

PFV MAS DE GIL

INFORME SEMANAL (Semana 44)



1. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y SOCIAL FASE DE OBRA

En el presente informe semanal se detallan las tareas realizadas en la **semana 44 del año 2024** durante la fase de obra del PFV MAS DE GIL.

1.1. SEGUIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024

Este informe corresponde con el **quinto y último informe semanal del mes de octubre**.

1.1.1. Tabla resumen de tareas

En la siguiente tabla vienen detalladas todas las tareas realizadas por el departamento de Sostenibilidad, ya sean las tareas realizadas por el responsable ambiental y social del clúster y las tareas realizadas por el personal de soporte y seguimiento administrativo, relativas a la comunicación con la administración, organismos y terceras partes implicadas en el proyecto, en función de las necesidades y obligaciones del proyecto.

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
1	- SOST - Jalonamiento de todas las zonas de obras, quedando sus límites definidos, y de las zonas con vegetación natural a preservar	30/10/24	DIA	SEMANAL
2	- SOST - Las zonas de acopios de materiales y parques de maquinaria se ubicarán en zonas agrícolas o en zonas desprovistas de vegetación.	30/10/24	DIA	SEMANAL
3	- SOST - Gestión de los residuos de construcción y demolición	30/10/24	DIA	SEMANAL
4	- SOST - Gestión de los residuos	30/10/24	DIA	SEMANAL
5	- SOST - Prevención contra incendios	30/10/24	DIA	SEMANAL
6	- SOST - Realizar informes semanales	30/10/24	INTERNO	SEMANAL

EIA: Estudio de Impacto Ambiental; DIA: Declaración de Impacto Ambiental, Cond. Carreteras: Condicionados Carreteras; Cond. CHE: Condicionados Confederación Hidrográfica del Ebro, DGCP ARQ: Dirección General de Patrimonio y Cultura

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
7	- SOST - Vigilancia de la protección de la vegetación natural	30/10/24	EIA	SEMANAL
8	- SOST - Control de la retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal	30/10/24	EIA	SEMANAL
9	- SOST - Trabajo de Gabinete	30/10/24	INTERNO	SEMANAL
10	- SOST - Control de polvo y partículas	30/10/24	EIA	SEMANAL
11	- SOST - Control de la alteración y compactación de los suelos	30/10/24	DIA	SEMANAL
12	- SOST - Redes de drenaje y de la calidad de las aguas	30/10/24	DIA	SEMANAL
13	- SOST - Trabajo de Gabinete	30/10/24	DIA	SEMANAL
14	- SOST - El vallado perimetral será permeable a la fauna.	30/10/24	DIA	QUINCENAL
15	- SOST - Control de gases y humos	30/10/24	EIA	QUINCENAL
16	- SOST - Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial	30/10/24	EIA	MENSUAL
17	- SOST - Se realizará el extendido de 30 cm de espesor de la tierra vegetal procedente del desbroce y decapado dentro de la planta de manera que se aproveche el banco de semillas que albergue	30/10/24	DIA	MENSUAL
18	- SOST - Se plantarán especies arbustivas alrededor del vallado perimetral de la planta fotovoltaica con el fin de crear una pantalla visual que minimice el impacto visual y que permita a la instalación mimetizarse mejor con el entorno.	30/10/24	DIA	MENSUAL
19	- SOST - Control de los niveles de ruido	30/10/24	EIA	MENSUAL
20	- SOST – Evitar el abandono de cadáveres animales	30/10/24	DIA	MENSUAL
21	- SOST - Vigilancia de la erosión del suelo y taludes	30/10/24	EIA	MENSUAL
22	- SOST - Adecuación paisajística de las instalaciones	30/10/24	EIA	MENSUAL
23	- SOST - Reposición de los servicios afectados	30/10/24	EIA	MENSUAL

Tabla 1. Tabla de tareas realizadas durante la semana 44.

1.1.1.1. Fichas de los controles realizados

A continuación, vienen detalladas todas las fichas de los trabajos realizados que, debido a que son realizadas de forma periódica, y que por norma general llevan asociada documentación complementaria, vienen explicadas en formato de ficha para una mejor comprensión.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL: COND: 10x03
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 10. RESTAURACIÓN	FECHA: 30/10/2024	
TIPO DE CONTROL:	GEOLÓGICO		
CONTROL:	Movimientos de tierra.		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Implantación

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Acopios de tierra vegetal.



Figura 2. Movimientos de tierra.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL: COND: 10x03
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 10. RESTAURACIÓN	FECHA: 30/10/2024	
TIPO DE CONTROL:	GEOLÓGICO		
CONTROL:	Movimientos de tierra.		



Figura 3. Movimientos de tierra.



Figura 4. Movimientos de tierra.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Durante el control realizado durante la presente semana, se ha podido comprobar el inicio de los trabajos de nivelación del terreno, en el que se puede observar como la maquinaria elimina taludes y desniveles, esparciendo la tierra y allanando el terreno.

Se tiene correctamente colocada la tierra vegetal, con el objetivo de reutilizarla posteriormente en las superficies proyectadas para su recuperación.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL: COND: 15x12
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 15. GESTION DE RESIDUOS		FECHA: 30/10/2024
TIPO DE CONTROL:	RESIDUOS		
CONTROL:	Instalación de punto limpio.		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Implantación

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Contenedor de residuos peligrosos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Durante la presente semana, han llegado los contenedores destinados a residuos peligrosos al punto limpio, pero aun no tienen el debido etiquetado. Se ha acordado se que colocaran en breve.

1.2. HOJA DE FIRMAS

Este informe está suscrito por los siguientes trabajadores de Athmos Sostenibilidad en,

Zaragoza, a 04 de noviembre de 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Luis', with a long horizontal stroke extending to the right.

Fdo: Jose Luis Cabello Morales

Vigilante Ambiental y Social de la Planta
fotovoltaica Mas de Gil.

PFV MAS DE GIL

INFORME SEMANAL (Semana 45)



1. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y SOCIAL FASE DE OBRA

En el presente informe semanal se detallan las tareas realizadas en la **semana 45 del año 2024** durante la fase de obra del PFV MAS DE GIL.

1.1. SEGUIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024

Este informe corresponde con el **primer informe semanal del mes de noviembre**.

1.1.1. Tabla resumen de tareas

En la siguiente tabla vienen detalladas todas las tareas realizadas por el departamento de Sostenibilidad, ya sean las tareas realizadas por el responsable ambiental y social del clúster y las tareas realizadas por el personal de soporte y seguimiento administrativo, relativas a la comunicación con la administración, organismos y terceras partes implicadas en el proyecto, en función de las necesidades y obligaciones del proyecto.

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
1	- SOST - Jalonamiento de todas las zonas de obras, quedando sus límites definidos, y de las zonas con vegetación natural a preservar	30/10/24	DIA	SEMANAL
2	- SOST - Las zonas de acopios de materiales y parques de maquinaria se ubicarán en zonas agrícolas o en zonas desprovistas de vegetación.	30/10/24	DIA	SEMANAL
3	- SOST - Gestión de los residuos de construcción y demolición	30/10/24	DIA	SEMANAL
4	- SOST - Gestión de los residuos	30/10/24	DIA	SEMANAL
5	- SOST - Prevención contra incendios	30/10/24	DIA	SEMANAL
6	- SOST - Realizar informes semanales	30/10/24	INTERNO	SEMANAL

EIA: Estudio de Impacto Ambiental; DIA: Declaración de Impacto Ambiental, Cond. Carreteras: Condicionados Carreteras; Cond. CHE: Condicionados Confederación Hidrográfica del Ebro, DGCP ARQ: Dirección General de Patrimonio y Cultura

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
7	- SOST - Vigilancia de la protección de la vegetación natural	30/10/24	EIA	SEMANAL
8	- SOST - Control de la retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal	30/10/24	EIA	SEMANAL
9	- SOST - Trabajo de Gabinete	30/10/24	INTERNO	SEMANAL
10	- SOST - Control de polvo y partículas	30/10/24	EIA	SEMANAL
11	- SOST - Control de la alteración y compactación de los suelos	30/10/24	EIA	SEMANAL
12	- SOST - Redes de drenaje y de la calidad de las aguas	30/10/24	DIA	SEMANAL
13	- SOST - Trabajo de Gabinete	30/10/24	DIA	SEMANAL

Tabla 1. Tabla de tareas realizadas durante la semana 44.

1.1.1.1. Fichas de los controles realizados

A continuación, vienen detalladas todas las fichas de los trabajos realizados que, debido a que son realizadas de forma periódica, y que por norma general llevan asociada documentación complementaria, vienen explicadas en formato de ficha para una mejor comprensión.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL: COND: 10x04
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 10. RESTAURACIÓN	FECHA: 06/11/2024	
TIPO DE CONTROL:	GEOLÓGICO		
CONTROL:	Movimientos de tierra.		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Implantación

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Movimientos de tierra.



Figura 2. Movimientos de tierra.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Durante el control realizado durante la presente semana, se ha podido comprobar el inicio de los trabajos de nivelación del terreno, en el que se puede observar como la maquinaria elimina taludes y desniveles, esparciendo la tierra y allanando el terreno.

Se puede observar como el proceso ha avanzado con respecto a semanas anteriores.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL: COND: 15x13
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 15. GESTION DE RESIDUOS		FECHA: 06/11/2024
TIPO DE CONTROL:	RESIDUOS		
CONTROL:	Instalación de punto limpio.		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Implantación

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:




Figura 1. Contenedor de residuos peligrosos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Tal como se acordó en la visita anterior, se le ha colocado las correspondientes etiquetas a los contenedores de residuos peligrosos, pudiendo diferenciarse así los distintos tipos.

1.2. HOJA DE FIRMAS

Este informe está suscrito por los siguientes trabajadores de Athmos Sostenibilidad en,

Zaragoza, a 04 de noviembre de 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Luis', with a long horizontal stroke extending to the right.

Fdo: Jose Luis Cabello Morales

Vigilante Ambiental y Social de la Planta
fotovoltaica Mas de Gil.

PFV MAS DE GIL

INFORME SEMANAL (Semana 46)



1. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y SOCIAL FASE DE OBRA

En el presente informe semanal se detallan las tareas realizadas en la **semana 46 del año 2024** durante la fase de obra del PFV MAS DE GIL.

1.1. SEGUIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024

Este informe corresponde con el **segundo informe semanal del mes de noviembre**.

1.1.1. Tabla resumen de tareas

En la siguiente tabla vienen detalladas todas las tareas realizadas por el departamento de Sostenibilidad, ya sean las tareas realizadas por el responsable ambiental y social del clúster y las tareas realizadas por el personal de soporte y seguimiento administrativo, relativas a la comunicación con la administración, organismos y terceras partes implicadas en el proyecto, en función de las necesidades y obligaciones del proyecto.

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
1	- SOST - Jalonamiento de todas las zonas de obras, quedando sus límites definidos, y de las zonas con vegetación natural a preservar	13/11/24	DIA	SEMANAL
2	- SOST - Las zonas de acopios de materiales y parques de maquinaria se ubicarán en zonas agrícolas o en zonas desprovistas de vegetación.	13/11/24	DIA	SEMANAL
3	- SOST - Gestión de los residuos de construcción y demolición	13/11/24	DIA	SEMANAL
4	- SOST - Gestión de los residuos	13/11/24	DIA	SEMANAL
5	- SOST - Prevención contra incendios	13/11/24	DIA	SEMANAL
6	- SOST - Realizar informes semanales	13/11/24	INTERNO	SEMANAL

EIA: Estudio de Impacto Ambiental; DIA: Declaración de Impacto Ambiental, Cond. Carreteras: Condicionados Carreteras; Cond. CHE: Condicionados Confederación Hidrográfica del Ebro, DGCP ARQ: Dirección General de Patrimonio y Cultura

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
7	- SOST - Vigilancia de la protección de la vegetación natural	13/11/24	EIA	SEMANAL
8	- SOST - Control de la retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal	13/11/24	EIA	SEMANAL
9	- SOST - Control de polvo y partículas	13/11/24	EIA	SEMANAL
10	- SOST - Control de la alteración y compactación de los suelos	13/11/24	EIA	SEMANAL
11	- SOST - Redes de drenaje y de la calidad de las aguas	13/11/24	DIA	SEMANAL
12	- SOST - El vallado perimetral será permeable a la fauna.	13/11/24	DIA	QUINCENAL
13	- SOST - Control de gases y humos	13/11/24	EIA	QUINCENAL
14	- SOST - Trabajo de Gabinete	15/11/24	INTERNO	SEMANAL

Tabla 1. Tabla de tareas realizadas durante la semana 46.

1.1.1.1. Fichas de los controles realizados

A continuación, vienen detalladas todas las fichas de los trabajos realizados que, debido a que son realizadas de forma periódica, y que por norma general llevan asociada documentación complementaria, vienen explicadas en formato de ficha para una mejor comprensión.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL: COND: 12x04
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 12. VALLADO		FECHA: 13/11/2024
TIPO DE CONTROL:	INSTALACION DEL VALLADO		
CONTROL:	Revisión de las actividades de vallado		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Vallado exterior de la planta fotovoltaica

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Vallado perimetral

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Durante la visita de esta semana, se ha podido ver que ya han sido correctamente colocadas las placas de correspondientes en el vallado de la planta, tal como queda estipulado en el condicionado N.º 12 de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.

1.2. HOJA DE FIRMAS

Este informe está suscrito por los siguientes trabajadores de Athmos Sostenibilidad en,

Zaragoza, a 18 de noviembre de 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Luis', with a long horizontal stroke extending to the right.

Fdo: Jose Luis Cabello Morales

Vigilante Ambiental y Social de la Planta
fotovoltaica Mas de Gil.

PFV MAS DE GIL

INFORME SEMANAL (Semana 47)



1. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y SOCIAL FASE DE OBRA

En el presente informe semanal se detallan las tareas realizadas en la **semana 47 del año 2024** durante la fase de obra del PFV MAS DE GIL.

1.1. SEGUIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024

Este informe corresponde con el **tercer informe semanal del mes de noviembre**.

1.1.1. Tabla resumen de tareas

En la siguiente tabla vienen detalladas todas las tareas realizadas por el departamento de Sostenibilidad, ya sean las tareas realizadas por el responsable ambiental y social del clúster y las tareas realizadas por el personal de soporte y seguimiento administrativo, relativas a la comunicación con la administración, organismos y terceras partes implicadas en el proyecto, en función de las necesidades y obligaciones del proyecto.

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
1	- SOST - Jalonamiento de todas las zonas de obras, quedando sus límites definidos, y de las zonas con vegetación natural a preservar	20/11/24	DIA	SEMANAL
2	- SOST - Las zonas de acopios de materiales y parques de maquinaria se ubicarán en zonas agrícolas o en zonas desprovistas de vegetación.	20/11/24	DIA	SEMANAL
3	- SOST - Gestión de los residuos de construcción y demolición	20/11/24	DIA	SEMANAL
4	- SOST - Gestión de los residuos	20/11/24	DIA	SEMANAL
5	- SOST - Prevención contra incendios	20/11/24	DIA	SEMANAL
6	- SOST - Realizar informes semanales	20/11/24	INTERNO	SEMANAL

EIA: Estudio de Impacto Ambiental; DIA: Declaración de Impacto Ambiental, Cond. Carreteras: Condicionados Carreteras; Cond. CHE: Condicionados Confederación Hidrográfica del Ebro, DGCP ARQ: Dirección General de Patrimonio y Cultura

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
7	- SOST - Vigilancia de la protección de la vegetación natural	20/11/24	EIA	SEMANAL
8	- SOST - Control de la retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal	20/11/24	EIA	SEMANAL
9	- SOST - Control de polvo y partículas	20/11/24	EIA	SEMANAL
10	- SOST - Control de la alteración y compactación de los suelos	20/11/24	EIA	SEMANAL
11	- SOST - Redes de drenaje y de la calidad de las aguas	20/11/24	DIA	SEMANAL
12	- SOST - Compensar las superficies de vegetación natural afectadas	20/11/24	DIA	CUANDO SEA NECESARIO
13	- SOST - Trabajo de Gabinete	20/11/24	INTERNO	SEMANAL

Tabla 1. Tabla de tareas realizadas durante la semana 47.

1.1.1.1. Fichas de los controles realizados

A continuación, vienen detalladas todas las fichas de los trabajos realizados que, debido a que son realizadas de forma periódica, y que por norma general llevan asociada documentación complementaria, vienen explicadas en formato de ficha para una mejor comprensión.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL: COND: 09x01
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 9. COMPENZACION DE VEGETACIÓN NATURAL	FECHA: 20/11/2024	
TIPO DE CONTROL:	DESPLAZAMIENTO DE ARBOLES		
CONTROL:	Revisión de las actividades movimiento vegetal		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Interior de la planta

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Olivo

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Dentro del perímetro de la planta se encuentran diversos olivos. Estos, debido a su ubicación, pueden entorpecer o impedir la construcción de diversos elementos del proyecto. A causa de esto, y por no provocar su destrucción, se ha decidido desplazar/recolocar los olivos, aprovechando las épocas actuales, en las que tienen menos estrés hídrico.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL:
			COND: 12x05
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 12. VALLADO		FECHA: 20/11/2024
TIPO DE CONTROL:	INSTALACION DEL VALLADO		
CONTROL:	Revisión de las actividades de vallado		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Vallado exterior de la planta fotovoltaica

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Vallado perimetral

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Durante la visita de esta semana, se ha comprobado que el vallado de la planta se encuentra ya colocado y finalizado. Los pasos de fauna se encuentran correctamente localizados y preparados, pero se han encontrado diversos alambres punzantes doblados hacia abajo, pudiendo provocar que cualquier animal que decida usarlos sufran heridas a causa de esto. Dichos desperfectos en los pasos de fauna deberían impedirse dentro de lo posible.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL	FICHA CONTROL: COND 05
ORIGEN DE CONTROL:	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Expte.: 025/21/23/2024 Exp. Prev.: 001/21.012	FECHA: 22/11/2024
TIPO DE CONTROL:	Control Arqueológico de los movimientos de tierra	
CONTROL:	Movimientos de tierra referente a los desmontes y nivelaciones	


PROYECTOS:

Planta Fotovoltaica Mas de Gil

PUNTOS DE CONTROL:


Control y seguimiento con metodología arqueológica durante los movimientos de nivelación del terreno, tanto de desmonte como de terraplenado.

IMÁGENES, PLANOS Y TABLAS:

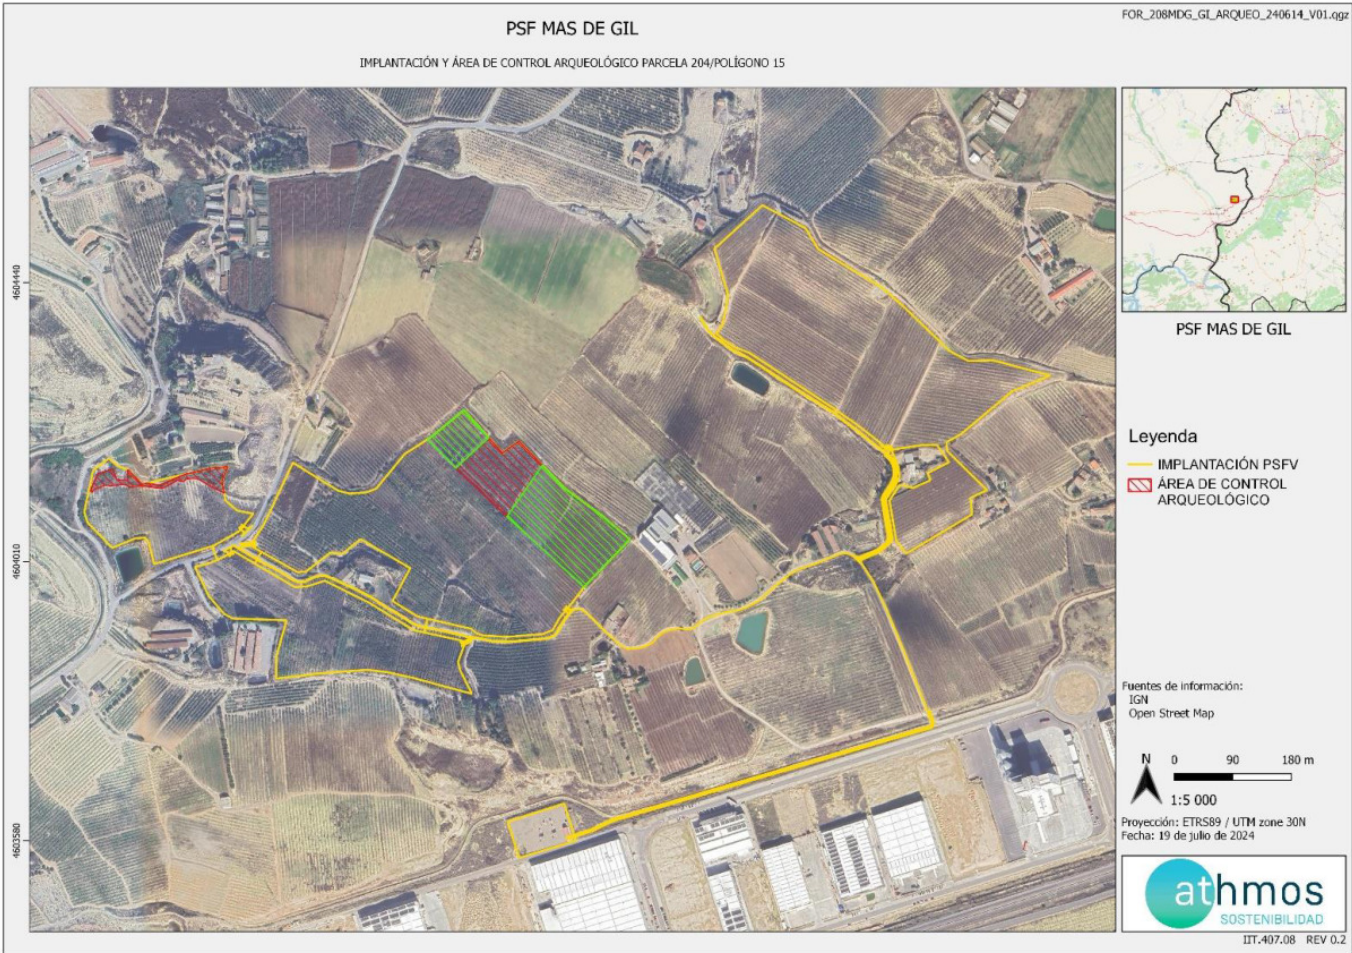


Mapa 1: Ubicación de la Planta Fotovoltaica y áreas de Control Arqueológico

	PROYECTO PFV MAS DE GIL	FICHA CONTROL: COND 05
ORIGEN DE CONTROL:	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Expte.: 025/21/23/2024 Exp. Prev.: 001/21.012	FECHA: 22/11/2024
TIPO DE CONTROL:	Control Arqueológico de los movimientos de tierra	
CONTROL:	Movimientos de tierra referente a los desmontes y nivelaciones	

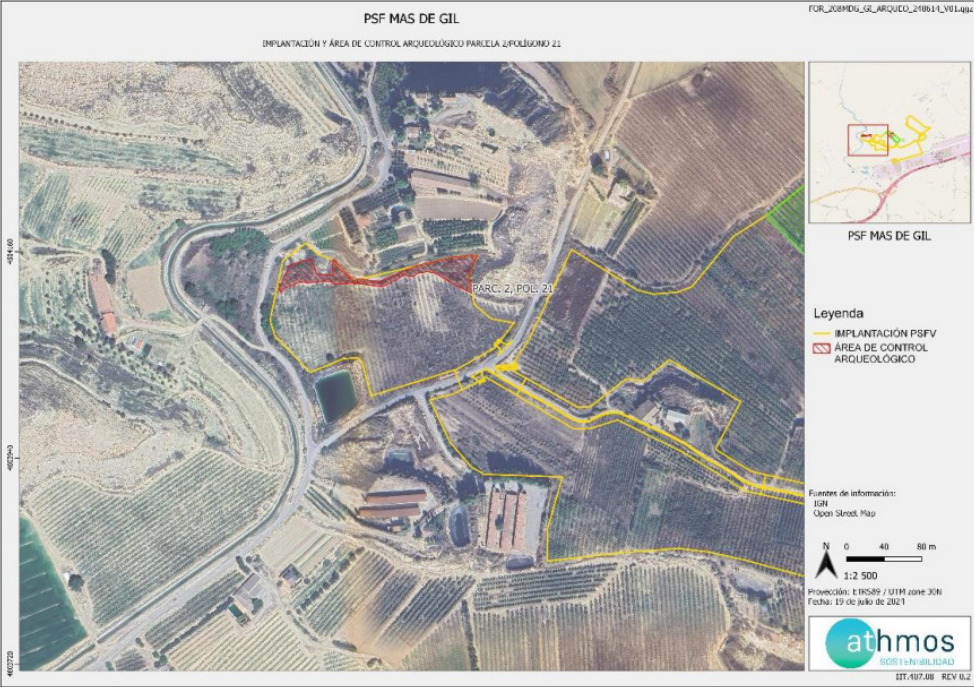

Mapa 2: Control y seguimiento; Parcela 2, Polígono 21

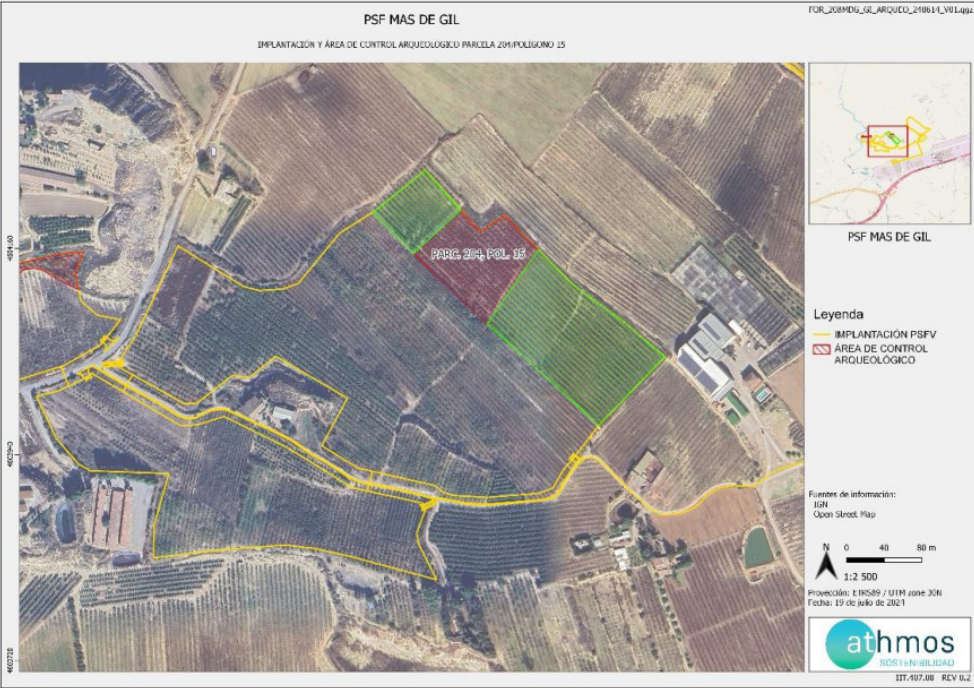

Mapa 3: Control y seguimiento; Parcela 204, Polígono 15

	PROYECTO PFV MAS DE GIL	FICHA CONTROL: COND 05
ORIGEN DE CONTROL:	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Expte.: 025/21/23/2024 Exp. Prev.: 001/21.012	FECHA: 22/11/2024
TIPO DE CONTROL:	Control Arqueológico de los movimientos de tierra	
CONTROL:	Movimientos de tierra referente a los desmontes y nivelaciones	

 Imagen 1: Nivelaciones en Polígono 15, Parcela 204	 Imagen 2: Nivelaciones en Polígono 15, Parcela 204
 Imagen 3: Nivelaciones en Polígono 15, Parcela 204	 Imagen 4: Nivelaciones en Polígono 15, Parcela 204
 Imagen 5: Cerámicas encontradas en Polígono 15, Parcela 204. Posible antigua tubería.	 Imagen 6: Cerámicas encontradas en Polígono 15, Parcela 204. Posible antigua tubería.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL	FICHA CONTROL: COND 05
ORIGEN DE CONTROL:	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Expte.: 025/21/23/2024 Exp. Prev.: 001/21.012	FECHA: 22/11/2024
TIPO DE CONTROL:	Control Arqueológico de los movimientos de tierra	
CONTROL:	Movimientos de tierra referente a los desmontes y nivelaciones	
 Imagen 7: Nivelaciones en Polígono 21, Parcela 2  Imagen 8: Nivelaciones en Polígono 21, Parcela 2  Imagen 9: Nivelaciones en Polígono 21, Parcela 2  Imagen 10: Nivelaciones en Polígono 21, Parcela 2		

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL: COND 05
ORIGEN DE CONTROL:	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Expte.: 025/21/23/2024 Exp. Prev.: 001/21.012		FECHA: 22/11/2024
TIPO DE CONTROL:	Control Arqueológico de los movimientos de tierra		
CONTROL:	Movimientos de tierra referente a los desmontes y nivelaciones		

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

El origen de la intervención lo encontramos en los trabajos de prospección arqueológica realizados en mayo de 2021 y en noviembre de 2023 más recientemente, en la zona donde se proyecta la implantación de la Planta Solar Fotovoltaica “Mas de Gil”. Por la mala visibilidad del terreno prospectado, la empresa encargada de los trabajos arqueológicos recomienda un control y seguimiento con metodología arqueológica de aquellas mismas zonas en las que, por la nula o deficiente visibilidad, no se ha podido constatar que no hubiese ningún resto patrimonial susceptible de ser afectado por las futuras obras.

Se han establecido dos áreas cuya superficie presentaba una nula visibilidad debido a la presencia de abundante vegetación silvestre que impedía la inspección de la superficie del terreno. Se trata de parte del Polígono 15, Parcela 204 que llevaba largo tiempo sin ser explotada; y de la zona anexa a la acequia del Polígono 21, Parcela 2. Dado que estas condiciones de visibilidad son constantes lo largo del tiempo, al no tratarse de campos en explotación que puedan ser labrados en algún momento, se proponen tareas de control y seguimiento de obra para ambos espacios

La resolución correspondiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural establece en consecuencia que:

Se deberá realizar el control y seguimiento arqueológico del desbrozado y de los movimientos de tierras previstos en la Parcela 204 del Polígono 15 y en la zona anexa a la acequia de la Parcela 2, Polígono 21.

Por tanto, los trabajos realizados tienen como objetivo cumplir con lo citado en la resolución de Patrimonio.

Durante los días 18, 19 y 20 de noviembre, se han llevado a cabo los trabajos de nivelación del terreno, tanto desmontes como terraplenados. Estos trabajos se han dado en ambas parcelas que llevan el control arqueológico, mediante el uso de dos traíllas y, en algunos momentos, debido a las características del propio suelo, con un rastrillo excavadora.

Durante la nivelación en la zona del Polígono 15, Parcela 204, se localizaron una serie de fragmentos cerámicos de adscripción contemporánea (imágenes 5 y 6) que tenían cierta continuidad. Es posible que se tratase de una de las tuberías o desagües de alguna antigua torre o edificación que ya no existe en el lugar de los trabajos, y antes de la aparición de materiales más modernos para la fabricación de las tuberías.

En cualquier caso, al margen de este hallazgo aislado, el resto de los trabajos han sido negativos arqueológicamente, no siendo necesaria ninguna actuación complementaria en materia preventiva.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL	FICHA CONTROL: COND 05
ORIGEN DE CONTROL:	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Expte.: 025/21/23/2024 Exp. Prev.: 001/21.012	FECHA: 22/11/2024
TIPO DE CONTROL:	Control Arqueológico de los movimientos de tierra	
CONTROL:	Movimientos de tierra referente a los desmontes y nivelaciones	

Pendiente quedarían de control arqueológico el resto de tareas que conlleven movimientos de tierra a realizar en las parcelas delimitadas, como podrían ser la excavación de las zanjas de conexión eléctrica, drenajes, etc. (ver tabla 1).

PSFV MAS DE GIL. TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS		
TÁREA	PREVISIÓN	ESTADO
<i>Arrancado de arbolado de las parcelas</i>	15 AL 17 DE JULIO	REALIZADO
<i>Decapado de las parcelas objeto de Control Arqueológico</i>	15 AL 17 DE JULIO	REALIZADO
<i>Excavación de agujeros de poste para instalación del vallado si afectan a las parcelas objeto de Control Arqueológico</i>	14 y 16 DE OCTUBRE	REALIZADO
<i>Excavación de zanjas de cualquier tipología, si afectan a las parcelas objeto de Control Arqueológico</i>	A PARTIR DE SEPTIEMBRE	PENDIENTE
<i>Otros trabajos que conlleven movimientos de tierra en las parcelas objeto de Control Arqueológico</i>	A PARTIR DE SEPTIEMBRE	PENDIENTE
<i>Nivelaciones, desmontes y actuaciones que precisen remociones de tierra en las parcelas objeto de Control Arqueológico</i>	18 AL 20 DE NOVIEMBRE	REALIZADO
Tabla 1. Actualización de los trabajos arqueológicos en Mas de Gil		

1.2. HOJA DE FIRMAS

Este informe está suscrito por los siguientes trabajadores de Athmos Sostenibilidad en,

Zaragoza, a 21 de noviembre de 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Luis', with a long horizontal stroke extending to the right.

Fdo: Jose Luis Cabello Morales

Vigilante Ambiental y Social de la Planta
fotovoltaica Mas de Gil.

PFV MAS DE GIL

INFORME SEMANAL (Semana 48)



1. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y SOCIAL FASE DE OBRA

En el presente informe semanal se detallan las tareas realizadas en la **semana 48 del año 2024** durante la fase de obra del PFV MAS DE GIL.

1.1. SEGUIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024

Este informe corresponde con el **tercer informe semanal del mes de noviembre**.

1.1.1. Tabla resumen de tareas

En la siguiente tabla vienen detalladas todas las tareas realizadas por el departamento de Sostenibilidad, ya sean las tareas realizadas por el responsable ambiental y social del clúster y las tareas realizadas por el personal de soporte y seguimiento administrativo, relativas a la comunicación con la administración, organismos y terceras partes implicadas en el proyecto, en función de las necesidades y obligaciones del proyecto.

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
1	- SOST - Jalonamiento de todas las zonas de obras, quedando sus límites definidos, y de las zonas con vegetación natural a preservar	27/11/24	DIA	SEMANAL
2	- SOST - Las zonas de acopios de materiales y parques de maquinaria se ubicarán en zonas agrícolas o en zonas desprovistas de vegetación.	27/11/24	DIA	SEMANAL
3	- SOST - Gestión de los residuos de construcción y demolición	27/11/24	DIA	SEMANAL
4	- SOST - Gestión de los residuos	27/11/24	DIA	SEMANAL
5	- SOST - Prevención contra incendios	27/11/24	DIA	SEMANAL
6	- SOST - Realizar informes semanales	28/11/24	INTERNO	SEMANAL

EIA: Estudio de Impacto Ambiental; DIA: Declaración de Impacto Ambiental, Cond. Carreteras: Condicionados Carreteras; Cond. CHE: Condicionados Confederación Hidrográfica del Ebro, DGCP ARQ: Dirección General de Patrimonio y Cultura

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
7	- SOST - Vigilancia de la protección de la vegetación natural	27/11/24	EIA	SEMANAL
8	- SOST - Control de la retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal	27/11/24	EIA	SEMANAL
9	- SOST - Control de polvo y partículas	27/11/24	EIA	SEMANAL
10	- SOST - Control de la alteración y compactación de los suelos	27/11/24	EIA	SEMANAL
11	- SOST - Redes de drenaje y de la calidad de las aguas	27/11/24	DIA	SEMANAL
13	- SOST - Trabajo de Gabinete	27/11/24	INTERNO	SEMANAL
14	- SOST - El vallado perimetral será permeable a la fauna.	27/11/24	DIA	QUINCENAL
15	- SOST - Control de gases y humos	27/11/24	EIA	QUINCENAL
16	- SOST - Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial	27/11/24	EIA	MENSUAL
17	- SOST - Se realizará el extendido de 30 cm de espesor de la tierra vegetal procedente del desbroce y decapado dentro de la planta de manera que se aproveche el banco de semillas que albergue	27/11/24	DIA	MENSUAL
18	- SOST - Se plantarán especies arbustivas alrededor del vallado perimetral de la planta fotovoltaica con el fin de crear una pantalla visual que minimice el impacto visual y que permita a la instalación mimetizarse mejor con el entorno.	27/11/24	DIA	MENSUAL
19	- SOST - Control de los niveles de ruido	27/11/24	EIA	MENSUAL
20	- SOST – Evitar el abandono de cadáveres animales	27/11/24	DIA	MENSUAL
21	- SOST - Vigilancia de la erosión del suelo y taludes	27/11/24	EIA	MENSUAL
22	- SOST - Adecuación paisajística de las instalaciones	27/11/24	EIA	MENSUAL
23	- SOST - Reposición de los servicios afectados	27/11/24	EIA	MENSUAL

Tabla 1. Tabla de tareas realizadas durante la semana 48.

1.1.1.1. Fichas de los controles realizados

A continuación, vienen detalladas todas las fichas de los trabajos realizados que, debido a que son realizadas de forma periódica, y que por norma general llevan asociada documentación complementaria, vienen explicadas en formato de ficha para una mejor comprensión.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL:
			COND: 10x05
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 10. RESTAURACIÓN		FECHA: 27/11/2024
TIPO DE CONTROL:	GEOLÓGICO		
CONTROL:	Movimientos de tierra.		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Implantación

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Movimientos de tierra.



Figura 2. Movimientos de tierra.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

La nivelación de la planta fotovoltaica esta casi terminado, dejándose el terreno listo para el inicio del montaje cuando llegue el momento. Se recuerda que aquellas zonas comprendidas dentro de la planta, en las cuales no se vayan a colocar instalaciones, deberán tener posteriormente una correcta restauración.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL: COND: 12x06
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 12. VALLADO		FECHA: 27/11/2024
TIPO DE CONTROL:	INSTALACION DEL VALLADO		
CONTROL:	Revisión de las actividades de vallado		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Vallado exterior de la planta fotovoltaica

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Vallado perimetral

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

En la visita de esta semana se ha comprobado que muchas de las placas salvapajaros del vallado perimetral de la planta se han caído a causa de los fuertes vientos. Se ha hablado que los encargados de la instalación del vallado vuelvan para arreglar estos desperfectos, así como asegurar que no queden elementos punzantes en los pasos de fauna.

1.2. HOJA DE FIRMAS

Este informe está suscrito por los siguientes trabajadores de Athmos Sostenibilidad en,

Zaragoza, a 28 de noviembre de 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Luis', with a long horizontal stroke extending to the right.

Fdo: Jose Luis Cabello Morales

Vigilante Ambiental y Social de la Planta
fotovoltaica Mas de Gil.

PFV MAS DE GIL

INFORME SEMANAL (Semana 49)



1. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y SOCIAL FASE DE OBRA

En el presente informe semanal se detallan las tareas realizadas en la **semana 49 del año 2024** durante la fase de obra del PFV MAS DE GIL.

1.1. SEGUIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024

Este informe corresponde con el **primer informe semanal del mes de diciembre**.

1.1.1. Tabla resumen de tareas

En la siguiente tabla vienen detalladas todas las tareas realizadas por el departamento de Sostenibilidad, ya sean las tareas realizadas por el responsable ambiental y social del clúster y las tareas realizadas por el personal de soporte y seguimiento administrativo, relativas a la comunicación con la administración, organismos y terceras partes implicadas en el proyecto, en función de las necesidades y obligaciones del proyecto.

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
1	- SOST - Jalonamiento de todas las zonas de obras, quedando sus límites definidos, y de las zonas con vegetación natural a preservar	04/12/24	DIA	SEMANAL
2	- SOST - Las zonas de acopios de materiales y parques de maquinaria se ubicarán en zonas agrícolas o en zonas desprovistas de vegetación.	04/12/24	DIA	SEMANAL
3	- SOST - Gestión de los residuos de construcción y demolición	04/12/24	DIA	SEMANAL
4	- SOST - Gestión de los residuos	04/12/24	DIA	SEMANAL
5	- SOST - Prevención contra incendios	04/12/24	DIA	SEMANAL
6	- SOST - Realizar informes semanales	04/12/24	INTERNO	SEMANAL

EIA: Estudio de Impacto Ambiental; DIA: Declaración de Impacto Ambiental, Cond. Carreteras: Condicionados Carreteras; Cond. CHE: Condicionados Confederación Hidrográfica del Ebro, DGCP ARQ: Dirección General de Patrimonio y Cultura

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
7	- SOST - Vigilancia de la protección de la vegetación natural	04/12/24	EIA	SEMANAL
8	- SOST - Control de la retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal	04/12/24	EIA	SEMANAL
9	- SOST - Control de polvo y partículas	04/12/24	EIA	SEMANAL
10	- SOST - Control de la alteración y compactación de los suelos	04/12/24	EIA	SEMANAL
11	- SOST - Redes de drenaje y de la calidad de las aguas	04/12/24	DIA	SEMANAL
13	- SOST - Trabajo de Gabinete	04/12/24	INTERNO	SEMANAL

Tabla 1. Tabla de tareas realizadas durante la semana 49.

1.1.1.1. Fichas de los controles realizados

A continuación, vienen detalladas todas las fichas de los trabajos realizados que, debido a que son realizadas de forma periódica, y que por norma general llevan asociada documentación complementaria, vienen explicadas en formato de ficha para una mejor comprensión.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL: COND: 10x06
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 10. RESTAURACIÓN		FECHA: 04/12/2024
TIPO DE CONTROL:	GEOLÓGICO		
CONTROL:	Movimientos de tierra.		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Implantación

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Movimientos de tierra.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Se ha podido comprobar que todo el terreno ha sido nivelado, y por lo tanto finalizan los movimientos de tierra destinados a esta labor.

		PROYECTO PFV MAS DE GIL	FICHA CONTROL:
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 12. VALLADO		COND: 12x07
TIPO DE CONTROL:	INSTALACION DEL VALLADO		FECHA: 04/12/2024
CONTROL:	Revisión de las actividades de vallado		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Vallado exterior de la planta fotovoltaica

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Vallado perimetral



Figura 2. Paso de fauna

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

En la presente visita, se ha podido comprobar que los desperfectos ocasionados por el clima han sido resueltos en el vallado perimetral de la planta. Las placas salvapájaros han sido recolocadas, así como rectificada la altura de los pasos de fauna.

1.2. HOJA DE FIRMAS

Este informe está suscrito por los siguientes trabajadores de Athmos Sostenibilidad en,

Zaragoza, a 04 de diciembre de 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Luis', with a long horizontal stroke extending to the right.

Fdo: Jose Luis Cabello Morales

Vigilante Ambiental y Social de la Planta
fotovoltaica Mas de Gil.

PFV MAS DE GIL

INFORME SEMANAL (Semana 50)



1. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y SOCIAL FASE DE OBRA

En el presente informe semanal se detallan las tareas realizadas en la **semana 50 del año 2024** durante la fase de obra del PFV MAS DE GIL.

1.1. SEGUIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024

Este informe corresponde con el **segundo informe semanal del mes de diciembre**.

1.1.1. Tabla resumen de tareas

En la siguiente tabla vienen detalladas todas las tareas realizadas por el departamento de Sostenibilidad, ya sean las tareas realizadas por el responsable ambiental y social del clúster y las tareas realizadas por el personal de soporte y seguimiento administrativo, relativas a la comunicación con la administración, organismos y terceras partes implicadas en el proyecto, en función de las necesidades y obligaciones del proyecto.

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
1	Jalonamiento de todas las zonas de obras, quedando sus límites definidos, y de las zonas con vegetación natural a preservar	12/12/24	DIA	SEMANAL
2	Las zonas de acopios de materiales y parques de maquinaria se ubicarán en zonas agrícolas o en zonas desprovistas de vegetación.	12/12/24	DIA	SEMANAL
3	Gestión de los residuos de construcción y demolición	12/12/24	DIA	SEMANAL
4	Gestión de los residuos	12/12/24	DIA	SEMANAL
5	Prevención contra incendios	12/12/24	DIA	SEMANAL
6	Realizar informes semanales	12/12/24	INTERNO	SEMANAL
7	Vigilancia de la protección de la vegetación natural	12/12/24	EIA	SEMANAL

EIA: Estudio de Impacto Ambiental; DIA: Declaración de Impacto Ambiental, Cond. Carreteras: Condicionados Carreteras; Cond. CHE: Condicionados Confederación Hidrográfica del Ebro, DGCP ARQ: Dirección General de Patrimonio y Cultura

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
8	Control de la retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal	12/12/24	EIA	SEMANAL
9	Control de polvo y partículas	12/12/24	EIA	SEMANAL
10	Control de la alteración y compactación de los suelos	12/12/24	EIA	SEMANAL
11	Redes de drenaje y de la calidad de las aguas	12/12/24	DIA	SEMANAL
12	El vallado perimetral será permeable a la fauna.	12/12/24	DIA	MENSUAL
13	Control de gases y humos	12/12/24	EIA	MENSUAL
14	Trabajo de Gabinete	12/12/24	INTERNO	SEMANAL

Tabla 1. Tabla de tareas realizadas durante la semana 50.

1.1.1.1. Fichas de los controles realizados

A continuación, vienen detalladas todas las fichas de los trabajos realizados que, debido a que son realizadas de forma periódica, y que por norma general llevan asociada documentación complementaria, vienen explicadas en formato de ficha para una mejor comprensión.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL:
			COND: 09x02
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 9. COMPENZACION DE VEGETACIÓN NATURAL		FECHA: 12/12/2024
TIPO DE CONTROL:	DESPLAZAMIENTO DE ARBOLES		
CONTROL:	Revisión de las actividades movimiento vegetal		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Interior de la planta

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Trasplante de olivo

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Durante esta semana, se ha llevado a cabo la recolocación de cuatro olivos localizados en el interior de la planta. Dichos trasplantes se han realizado con la finalidad de aprovechar mejor el espacio que estos ocupaban sin perder los árboles. Fueron recolocados dentro de la planta, donde no supongan un problema para las instalaciones previstas en el proyecto.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL:
			COND: 10x07
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 10. RESTAURACIÓN		FECHA: 12/12/2024
TIPO DE CONTROL:	GEOLÓGICO		
CONTROL:	Movimientos de tierra.		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Implantación

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Movimientos de tierra.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Esta semana la mayor parte de los movimientos de tierra relacionados con la nivelación del terreno están finalizando. Actualmente, han iniciado trabajos correspondientes a as bases de las primeras estructuras de la planta. Podemos ver un correcto apilamiento de la tierra extraída, para su posterior uso

1.2. HOJA DE FIRMAS

Este informe está suscrito por los siguientes trabajadores de Athmos Sostenibilidad en,

Zaragoza, a 13 de diciembre de 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Luis', with a long horizontal stroke extending to the right.

Fdo: Jose Luis Cabello Morales

Vigilante Ambiental y Social de la Planta
fotovoltaica Mas de Gil.

PFV MAS DE GIL

INFORME SEMANAL (Semana 51)



1. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y SOCIAL FASE DE OBRA

En el presente informe semanal se detallan las tareas realizadas en la **semana 51 del año 2024** durante la fase de obra del PFV MAS DE GIL.

1.1. SEGUIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024

Este informe corresponde con el **tercer informe semanal del mes de diciembre**.

1.1.1. Tabla resumen de tareas

En la siguiente tabla vienen detalladas todas las tareas realizadas por el departamento de Sostenibilidad, ya sean las tareas realizadas por el responsable ambiental y social del clúster y las tareas realizadas por el personal de soporte y seguimiento administrativo, relativas a la comunicación con la administración, organismos y terceras partes implicadas en el proyecto, en función de las necesidades y obligaciones del proyecto.

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
1	Jalonamiento de todas las zonas de obras, quedando sus límites definidos, y de las zonas con vegetación natural a preservar	18/12/24	DIA	SEMANAL
2	Las zonas de acopios de materiales y parques de maquinaria se ubicarán en zonas agrícolas o en zonas desprovistas de vegetación.	18/12/24	DIA	SEMANAL
3	Gestión de los residuos de construcción y demolición	18/12/24	DIA	SEMANAL
4	Gestión de los residuos	18/12/24	DIA	SEMANAL
5	Prevención contra incendios	18/12/24	DIA	SEMANAL
6	Realizar informes semanales	18/12/24	INTERNO	SEMANAL
7	Vigilancia de la protección de la vegetación natural	18/12/24	EIA	SEMANAL

EIA: Estudio de Impacto Ambiental; DIA: Declaración de Impacto Ambiental, Cond. Carreteras: Condicionados Carreteras; Cond. CHE: Condicionados Confederación Hidrográfica del Ebro, DGCP ARQ: Dirección General de Patrimonio y Cultura

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
8	Control de la retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal	18/12/24	EIA	SEMANAL
9	Control de polvo y partículas	18/12/24	EIA	SEMANAL
10	Control de la alteración y compactación de los suelos	18/12/24	EIA	SEMANAL
11	Redes de drenaje y de la calidad de las aguas	18/12/24	DIA	SEMANAL
12	- SOST - Vigilancia de la erosión del suelo y taludes	18/12/24	EIA	MENSUAL
13	- SOST - Adecuación paisajística de las instalaciones	18/12/24	EIA	MENSUAL
14	- SOST - Reposición de los servicios afectados	18/12/24	EIA	MENSUAL
15	Trabajo de Gabinete	19/12/24	INTERNO	SEMANAL

Tabla 1. Tabla de tareas realizadas durante la semana 51.

1.1.1.1. Fichas de los controles realizados

A continuación, vienen detalladas todas las fichas de los trabajos realizados que, debido a que son realizadas de forma periódica, y que por norma general llevan asociada documentación complementaria, vienen explicadas en formato de ficha para una mejor comprensión.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL: COND: 09x03
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 9. COMPENZACION DE VEGETACIÓN NATURAL	FECHA: 18/12/2024	
TIPO DE CONTROL:	DESPLAZAMIENTO DE ARBOLES		
CONTROL:	Revisión de las actividades movimiento vegetal		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Interior de la planta

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Trasplante de olivo

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

En la presente semana se ha comprobado el estado de los olivos trasplantados. Todos ellos han sufrido una poda, con la esperanza de que se desarrollen correctamente en el futuro. Se ha incorporado un riego que mantenga hidratados a los olivos. En futuras visitas se comprobará su estado.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL:
			COND: 10x08
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 10. RESTAURACIÓN		FECHA: 18/12/2024
TIPO DE CONTROL:	GEOLÓGICO		
CONTROL:	Movimientos de tierra.		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Implantación

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Movimientos de tierra.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Se han continuado con los trabajos de montaje de las bases de los futuros seguidores. Se puede ver como todo esta debidamente señalizado, y los acopios de tierra correctamente colocados.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL:
			COND: 15x14
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 15. GESTION DE RESIDUOS		FECHA: 18/12/2024
TIPO DE CONTROL:	RESIDUOS		
CONTROL:	Instalación de punto limpio.		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Implantación

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Contenedor de residuos peligrosos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Para cumplir con los requisitos de la ley de residuos, se les ha colocado a los bidones de residuos peligrosos los debidos medios de seguridad para impedir posibles vertidos accidentales.

1.2. HOJA DE FIRMAS

Este informe está suscrito por los siguientes trabajadores de Athmos Sostenibilidad en,

Zaragoza, a 18 de diciembre de 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Luis', with a long horizontal stroke extending to the right.

Fdo: Jose Luis Cabello Morales

Vigilante Ambiental y Social de la Planta
fotovoltaica Mas de Gil.

PFV MAS DE GIL

INFORME SEMANAL (Semana 52)



1. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y SOCIAL FASE DE OBRA

En el presente informe semanal se detallan las tareas realizadas en la **semana 51 del año 2024** durante la fase de obra del PFV MAS DE GIL.

1.1. SEGUIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024

Este informe corresponde con el **cuarto y último informe semanal del mes de diciembre, siendo también el último del año 2024.**

1.1.1. Tabla resumen de tareas

En la siguiente tabla vienen detalladas todas las tareas realizadas por el departamento de Sostenibilidad, ya sean las tareas realizadas por el responsable ambiental y social del clúster y las tareas realizadas por el personal de soporte y seguimiento administrativo, relativas a la comunicación con la administración, organismos y terceras partes implicadas en el proyecto, en función de las necesidades y obligaciones del proyecto.

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
1	Jalonamiento de todas las zonas de obras, quedando sus límites definidos, y de las zonas con vegetación natural a preservar	18/12/24	DIA	SEMANAL
2	Las zonas de acopios de materiales y parques de maquinaria se ubicarán en zonas agrícolas o en zonas desprovistas de vegetación.	18/12/24	DIA	SEMANAL
3	Gestión de los residuos de construcción y demolición	18/12/24	DIA	SEMANAL
4	Gestión de los residuos	18/12/24	DIA	SEMANAL
5	Prevención contra incendios	18/12/24	DIA	SEMANAL
6	Realizar informes semanales	18/12/24	INTERNO	SEMANAL

EIA: Estudio de Impacto Ambiental; DIA: Declaración de Impacto Ambiental, Cond. Carreteras: Condicionados Carreteras; Cond. CHE: Condicionados Confederación Hidrográfica del Ebro, DGCP ARQ: Dirección General de Patrimonio y Cultura

Nº	TAREA	FECHA	ORIGEN ¹	PERIODICIDAD (DIAS)
7	Vigilancia de la protección de la vegetación natural	18/12/24	EIA	SEMANAL
8	Control de la retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal	18/12/24	EIA	SEMANAL
9	Control de polvo y partículas	18/12/24	EIA	SEMANAL
10	Control de la alteración y compactación de los suelos	18/12/24	EIA	SEMANAL
11	Redes de drenaje y de la calidad de las aguas	18/12/24	DIA	SEMANAL
15	Trabajo de Gabinete	19/12/24	INTERNO	SEMANAL

Tabla 1. Tabla de tareas realizadas durante la semana 52.

1.1.1.1. Fichas de los controles realizados

A continuación, vienen detalladas todas las fichas de los trabajos realizados que, debido a que son realizadas de forma periódica, y que por norma general llevan asociada documentación complementaria, vienen explicadas en formato de ficha para una mejor comprensión.

	PROYECTO PFV MAS DE GIL		FICHA CONTROL:
			COND: 10x09
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 10. RESTAURACIÓN		FECHA: 26/12/2024
TIPO DE CONTROL:	GEOLÓGICO		
CONTROL:	Movimientos de tierra.		

PROYECTOS: 208MDG

PUNTOS DE CONTROL: Implantación

IMAGENES, MAPAS, TABLAS:



Figura 1. Movimientos de tierra.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Los movimientos de tierra destinados a la nivelación de la planta están terminándose en la última parcela. Con estos, se darán por terminados los trabajos de este tipo, esperándose al inicio de creaciones de zanjas e hincados.

1.2. HOJA DE FIRMAS

Este informe está suscrito por los siguientes trabajadores de Athmos Sostenibilidad en,

Zaragoza, a 30 de diciembre de 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Luis', with a long horizontal stroke extending to the right.

Fdo: Jose Luis Cabello Morales

Vigilante Ambiental y Social de la Planta
fotovoltaica Mas de Gil.

6. INCIDENCIAS MEDIO AMBIENTALES DETECTADAS

Cuando se ha detectado alguna incidencia medioambiental, se ha informado a LEVITEC, siendo en este caso tanto empresa promotora como encargada de la obra civil.

Durante el presente periodo trimestral, no se ha detectado ninguna incidencia ni No conformidad.

7. CONCLUSIONES

Durante el periodo trimestral presente en este informe, las actividades han continuado con la gestión de los residuos correspondientes al desbroce de las parcelas.

Una vez astillado y recogido el residuo vegetal resultante, se ha utilizado la tierra vegetal resultante de las raíces en crear cordones de tierra vegetal que se usara a futuro para nutrir la pantalla vegetal y realizar restauración allí donde sea necesario.

Una vez terminada la recogida de residuos, durante el resto del trimestre se han dedicado a la realización de movimientos de tierra para nivelar los terrenos. La nivelación se ha desarrollado correctamente, y se han realizado los controles tanto ambientales como arqueológicos pertinentes.

También se ha colocado el vallado, que cuentan con sus correspondientes medidas y pasos de fauna.

Tras las nivelaciones, se han trasladado cuatro olivos que se encontraban en terreno destinado a paneles u otros componentes de la planta. Los cuatro se han colocado en un margen de la planta, donde no estorben y puedan recuperarse del proceso.

En los últimos controles realizados durante el trimestre, se estaba realizando ya el hormigonado de elementos claves para la planta.

ANEXO 1

PLANOS

PSFV MAS DE GIL

Implantación




PSFV MAS DE GIL


Leyenda

- Parque fotovoltaico
- Linea de evacuación

Fuentes de información:
IGN
Open Street Map



Proyección: ETRS89 / UTM zone 30N
Fecha: 4 de octubre de 2024

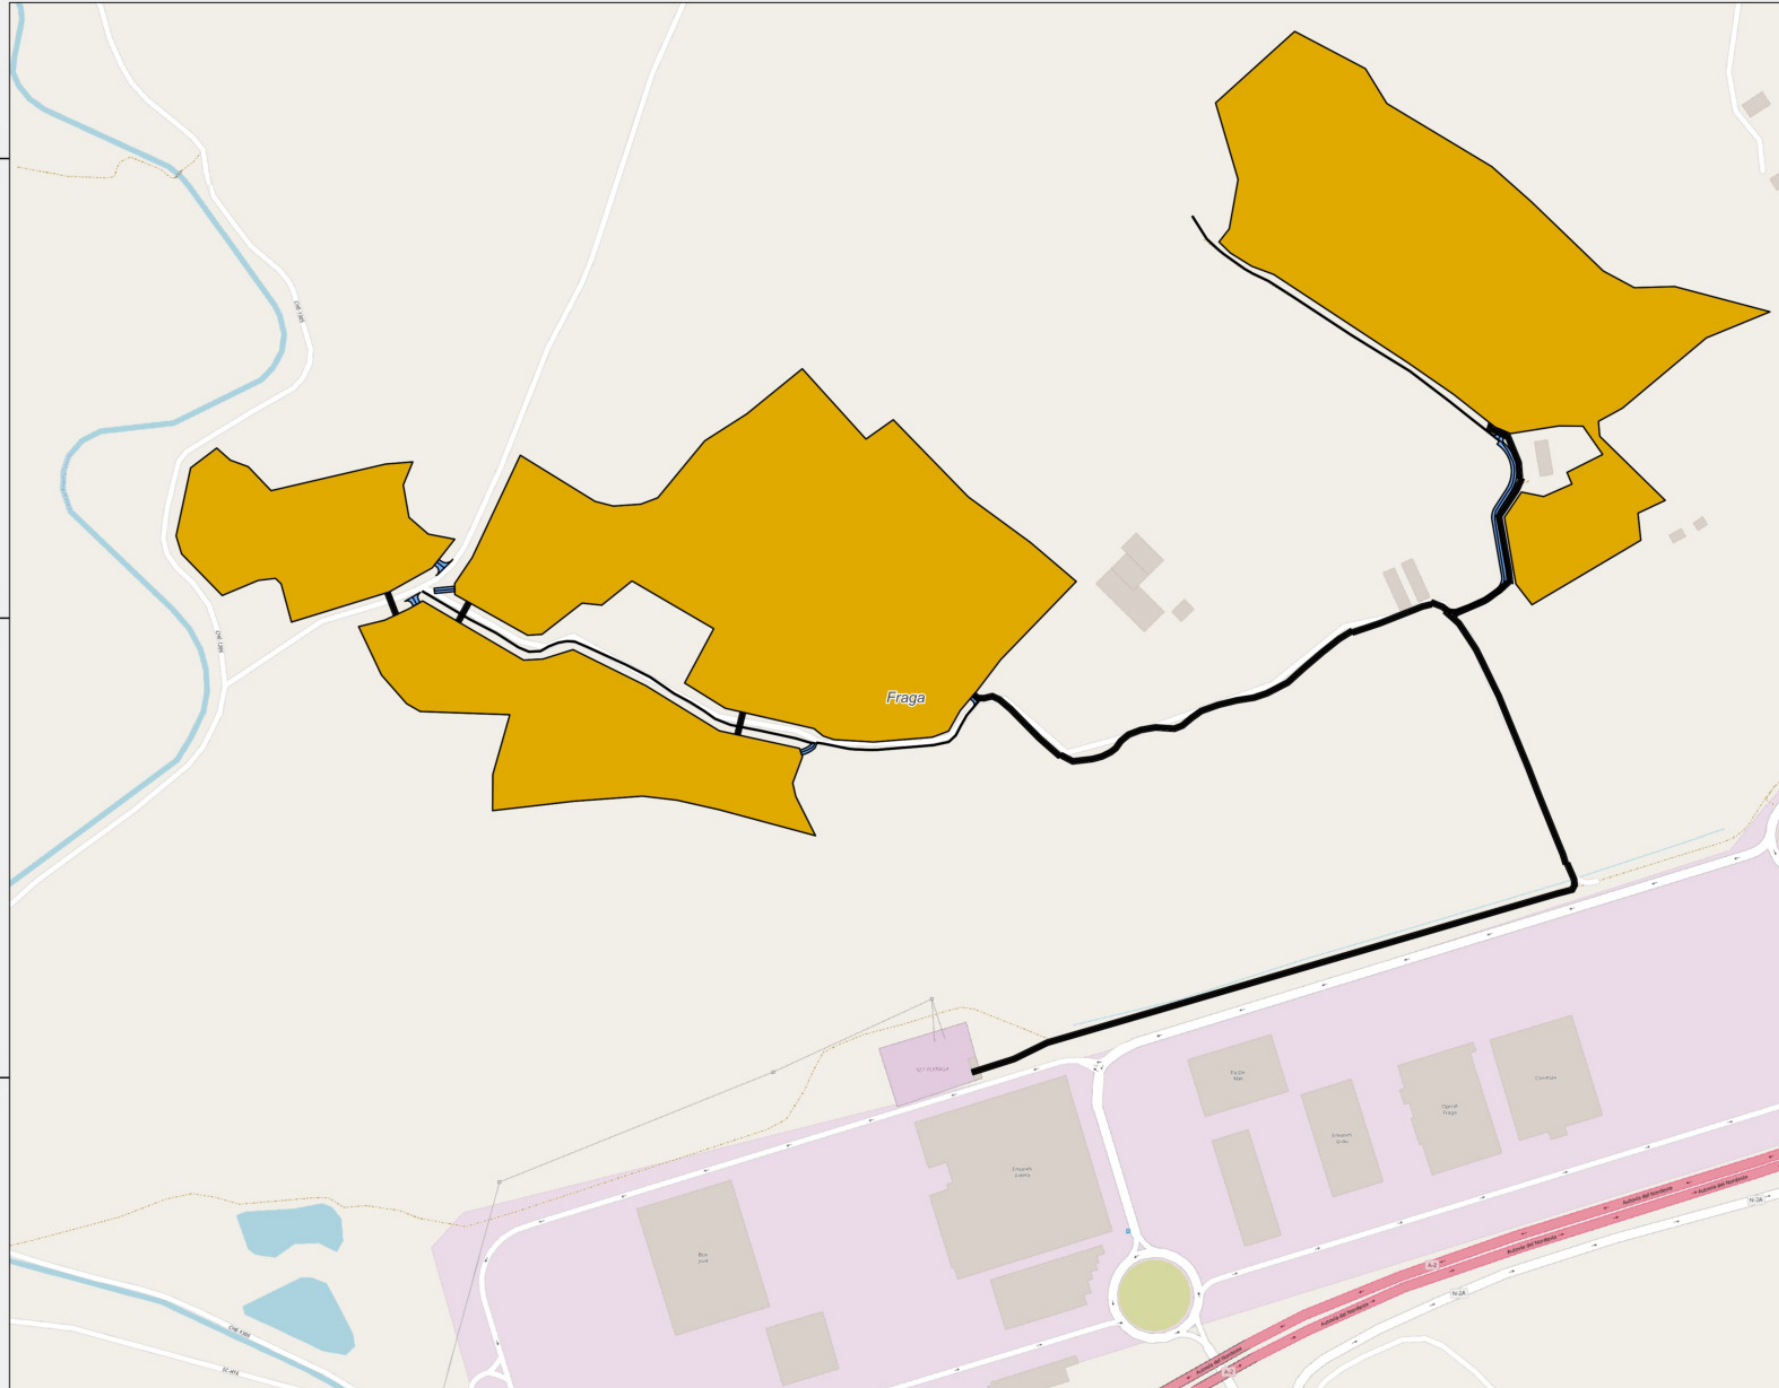

PFV MAS DE GIL

Afecciones




PFV MAS DE GIL

Leyenda

-  Parque fotovoltaico
-  Linea de evacuación
-  caminos
-  Canales
-  Afecciones canales

Fuentes de información:
IGN
Open Street Map



Proyección: ETRS89 / UTM zone 30N
Fecha: 7 de octubre de 2024

